



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением коллегии
Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия
от «16» марта 2021 года № 1

ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ законности и результативности использования средств бюджета
Республики Карелия, направленных на реализацию на территории
Республики Карелия региональных составляющих федеральных
(национальных) проектов в 2019 году и истекшем периоде 2020 года
(выборочно)», проведенного параллельно с муниципальными
контрольно-счетными органами**

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия (далее - Контрольно-счетная палата) на 2020 год, пункт 1.13 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год; пункт 2.1 плана работы Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия на 2020 год; постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 28.11.2019 № 1201-VI ЗС (подпункт 2 пункта 1); распоряжение Контрольно-счетной палаты от 29.10.2020 № 25 (в редакции распоряжений от 16.12.2020 № 31, от 15.02.2021 № 4); решения муниципальных контрольно-счетных органов.

Участники экспертно-аналитического мероприятия: Контрольно-счетная палата, Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа, контрольно-счетные органы Костомукшского городского округа, Кондопожского, муниципального района, контрольно-счетные комитеты Беломорского, Прионежского, Сегежского, Сортавальского муниципальных районов, контрольно-счетная комиссия Кемского муниципального района.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность рабочих органов и участников по разработке и реализации на территории Республики Карелия региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов (далее также – региональные проекты);

процессы, связанные с использованием средств бюджета Республики Карелия, средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию региональных проектов (выборочно).

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить процесс реализации на территории Республики Карелия региональных составляющих федеральных (национальных) проектов, законность и результативность (эффективность) использования бюджетных средств, выделенных на их реализацию (выборочно).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

1) органы исполнительной власти Республики Карелия, являющиеся ответственными за реализацию региональных проектов, а также участники системы управления проектной деятельностью на территории Республики Карелия;

2) исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, муниципальные учреждения и иные организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями региональных проектов (по результатам проведенных муниципальными контрольно-счетными органами Республики Карелия контрольных и экспертно-аналитических мероприятий).

Исследуемый период деятельности: 2019 – 2020 годы.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 октября 2020 года по 16 марта 2021 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы, формирования и использования государственных средств и деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) определены основные национальные цели развития Российской Федерации на указанный период, охватывающие самые важные направления как в экономике, так и в социальной сфере, с поручением разработать 12 национальных проектов (программ) и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее также - Комплексный план).

В целях реализации Указа № 204 президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам¹ (протокол заседания протокол от 24.12.2018 № 16) утверждены паспорта 12 национальных проектов (программ): «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р утвержден Комплексный план на период до 2024 года.

В структуру указанных национальных проектов входят 67 федеральных проектов, определяющих и конкретизирующих задачи и результаты национальных

¹ Указом Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 306 образован Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который Указом Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444 «Об упорядочении деятельности совещательных и консультационных органов при Президенте Российской Федерации» (далее – Указ № 444) преобразован в Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

проектов; в целях реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры утверждены 11 федеральных проектов¹.

На достижение установленных Указом № 204 целей развития за счет всех источников в течение 2019-2024 годов планировалось направить порядка 27 трлн. рублей, из них 13,5 трлн. рублей – за счет средств федерального бюджета¹.

Участие субъектов Российской Федерации в национальных проектах осуществляется путем реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в структуру национальных проектов, на принципах проектного управления.

В соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 22.05.2018 № ДМ-П13-2858 (далее – Поручение № ДМ-П13-2858) обеспечивалась интеграция национальных проектов в государственные программы (путем отражения в госпрограммах целей, задач, показателей и параметров финансового обеспечения региональных составляющих национальных проектов, что требовало постоянной актуализации государственных программ).

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) скорректированы национальные цели развития Российской Федерации (определены 5 целей: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация), увеличен горизонт планирования - до 2030 года, а также скорректированы или установлены новые целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей развития.

В соответствии с Указом № 474, а также протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 13.07.2020 № 4 в срок до 30 октября 2020 года Правительству Российской Федерации поручено привести национальные проекты в соответствие с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года², разработать единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (далее – Единый план).

При корректировке национальных проектов необходимо предусмотреть в их составе общественно значимые результаты, непосредственно влияющие на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности, и обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты.

В соответствии с Перечнем поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного Совета, утвержденным Президентом Российской

¹ Без учета положений Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», предусматривающего в том числе подготовку обновленных паспортов национальных проектов.

² С учетом мероприятий Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (Общенациональный план действий одобрен Правительством Российской Федерации 23.09.2020, протокол № 36, раздел VII (№ П13-60855 от 02.10.2020)).

Федерации 24.10.2020 № Пр-1726ГС, Правительству Российской Федерации поручено:

разработать при участии рабочих групп Государственного Совета Российской Федерации показатели, позволяющие контролировать ход достижения субъектами Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года;

определить для каждого субъекта Российской Федерации целевые значения данных показателей, обеспечить обсуждение этих значений с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, определить периодичность расчета фактических значений таких показателей, а также при наличии существенных разногласий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, касающихся значений таких показателей, предусмотреть порядок урегулирования разногласий;

обеспечить при утверждении национальных проектов (программ) и единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года включение целевых значений показателей в указанные проекты (программы) и Единый план.

Согласно Перечню поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 23.12.2020 (утвержден Президентом Российской Федерации 16.01.2021 № Пр-45ГС):

разработанный Правительством Российской Федерации проект Единого плана¹ принят за основу;

Правительству Российской Федерации поручено:

уточнить целевые значения показателей национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года с учетом их фактических значений по итогам 2020 года;

учесть необходимость уточнения ежегодных значений показателей национальных целей развития Российской Федерации в период до 2024 года исходя из необходимости достижения качественного улучшения по сравнению с уровнями 2018 года и значительного прогресса в период до 2024 года в достижении показателей национальных целей развития, установленных на 2030 год.

Таким образом, потребуется дальнейшая актуализация региональных составляющих национальных проектов, в том числе в части уточнения значений показателей, связанных с реализацией национальных проектов, в соответствии со сроками, установленными Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти.

В рамках реализации Указа № 204, во исполнение Поручения № ДМ-П13-2858 и в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – Постановление № 1288) Правительством Российской Федерации принят пакет нормативных

¹ Проект Единого плана содержит декомпозицию целевых показателей по месяцам и по каждому субъекту Российской Федерации; национальные проекты скорректированы в соответствии с обновленными целями и задачами.

правовых актов и иных документов по разработке, реализации, мониторингу национальных проектов.

Пунктом 2 Постановления № 1288 органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано организовать проектную деятельность, руководствуясь Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным указанным постановлением (далее также – Положение к Постановлению № 1288).

Пунктом 2 Положения к Постановлению № 1288 определено, что реализации в соответствии с указанным нормативным правовым актом подлежат национальные проекты (программы) и федеральные проекты (за исключением национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», особенности реализации которой устанавливаются отдельным актом Правительства Российской Федерации).

Также установлено, что планирование бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов и федеральных проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, с учетом результатов реализации национальных проектов за предыдущий период (пункт 9 Положения к Постановлению № 1288).

Пунктом 5 Положения к Постановлению № 1288 предусмотрено, что формирование, утверждение паспортов национальных, федеральных и региональных проектов, ежемесячных, ежеквартальных и итоговых отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система проектной деятельности¹, ГИИС «Электронный бюджет» соответственно).

Постановлением № 1288 также утверждены изменения в отдельные акты Правительства Российской Федерации, в том числе в Положение о ГИИС «Электронный бюджет», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 (в части дополнения ГИИС «Электронный бюджет» сервисной подсистемой управления национальными проектами). Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1528 корреспондирующие изменения внесены в Концепцию создания и развития ГИИС «Электронный бюджет», одобренную распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р; определено, что подсистема управления национальными проектами предназначена для организации разработки и мониторинга реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов во взаимосвязи с государственными программами

¹ Информационная система проектной деятельности предназначена для организации разработки и мониторинга реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов во взаимосвязи с государственными программами Российской Федерации в соответствии с объемами финансового обеспечения, предусмотренными на их реализацию.

Российской Федерации в соответствии с объемами финансового обеспечения, предусмотренными на их реализацию.

Пунктами 6, 7 Положения к Постановлению № 1288 определено, что сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации национальных, федеральных и региональных проектов осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАИС «Управление»)¹.

Указанные информация и данные в приоритетном порядке используются в информационной системе проектной деятельности при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.

Контрольно-счетная палата, обладая статусом участника стратегического планирования и осуществляя полномочия по контролю за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Республики Карелия и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проведению мониторинга реализации государственных программ, мониторингу исполнения бюджета Республики Карелия, экспертизе проектов законов о бюджете Республики Карелия, внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Республики Карелия, проводила мониторинг реализации с 01.01.2019 на территории республики национальных проектов.

Мониторинг и анализ реализации региональных проектов осуществлялся на основании нормативных правовых актов и иных документов, информации, представляемой Правительством Республики Карелия и органами исполнительной власти Республики Карелия, и дополнительно с 01.01.2020 - данных, размещаемых в информационной системе проектной деятельности (в ГИИС «Электронный бюджет»).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. Анализ процесса реализации на территории Республики Карелия региональных проектов.

1.1. Система управления разработкой и реализацией региональных проектов в Республике Карелия.

Для решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации в сфере организации проектной деятельности, в целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами в Республике Карелия, принято постановление Правительства Республики Карелия от 15.02.2017 № 64-П «Об управлении проектами в органах исполнительной власти Республики Карелия» (далее – Постановление № 64-П)², которым утверждены:

¹ Создание на базе ГАИС "Управление" подсистемы анализа реализации национальных проектов предусмотрено пунктом 3(2) Постановления № 1288; пунктом 3(3) установлен срок обеспечения интеграции и обмена данными информационной системы проектной деятельности с ГАИС «Управление» - не позднее 30.09.2021.

² По состоянию на 01.01.2021 (и на 01.03.2021) - в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 31.03.2020 № 115-П.

Положение об организации проектного управления в органах исполнительной власти Республики Карелия (далее – Положение к Постановлению № 64-П), применяемое к региональным составляющим национальных проектов, предусмотренных Указом № 204 (за исключением региональной составляющей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»);

функциональная структура органов управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Республики Карелия: проектный комитет, общественно-экспертная комиссия, региональный проектный офис.

Распоряжением Главы Республики Карелия от 26.04.2017 № 192-р образован проектный комитет¹, утвержден его персональный состав.

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 24.12.2018 № 853р-П (далее – Распоряжение № 853р-П) образован региональный проектный офис², в состав которого включены руководители органов исполнительной власти Республики Карелия, реализующие региональные проекты. Руководителем регионального проектного офиса и ответственным за проектное управление (координацию проектов в органах исполнительной власти Республики Карелия) в республике определен Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правительства Республики Карелия (согласно Распоряжению № 853р-П и пункту 2 Постановления № 64-П).

Экспертная комиссия в течение 2019 года создана не была. С 2020 года экспертная комиссия преобразована в общественно-экспертную комиссию³, определены ее основные задачи. Состав общественно-экспертной комиссии утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия от 29.01.2020 года № 36р-П.

Организационно-техническое обеспечение деятельности проектного комитета, регионального проектного офиса, общественно-экспертной комиссии осуществляет Администрация Главы Республики Карелия (пункты 19, 48, 36 соответствующих разделов приложения «Функциональная структура...» к Постановлению № 64-П).

Структура Администрации Главы Республики Карелия утверждена распоряжением Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 № 571р-П⁴, в состав контрольно-аналитического управления включен проектный офис (структурное подразделение, организующее контроль, внедрение и

¹ Коллегиальный орган, созданный при Главе Республики Карелия, принимающий решения на этапе планирования и контроля деятельности в период реализации проектов, достижения контрольных событий и показателей проектов и портфелей проектов (пункт 3 Положения к Постановлению № 64-П). Распоряжениями Главы Республики Карелия от 19.02.2018 № 92-р, от 30.05.2019 № 304-р, от 23.07.2020 № 432-р состав проектного комитета актуализирован.

² Коллегиальный орган, созданный при Первом заместителе Главы Республики Карелия - Премьер-министре Правительства Республики Карелия, осуществляющий оперативное управление проектной деятельностью, координацию реализации проектов, межведомственное взаимодействие (пункт 3 Положения к Постановлению № 64-П). Распоряжениями Правительства Республики Карелия от 30.01.2019 № 54р-П, от 01.07.2019 № 457р-П, от 22.11.2019 № 809р-П, от 23.07.2020 № 498р-П в состав регионального проектного офиса внесены изменения.

³ Совещательный консультативный орган по экспертному рассмотрению проектов, созданный при Правительстве Республики Карелия (пункт 3 Положения к Постановлению № 64-П, в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 24.01.2020 № 13-П).

⁴ По состоянию на 01.01.2021 - в редакции распоряжения Правительства Республики Карелия от 20.01.2020 № 21р-П, на 01.03.2021 - в редакции от 19.01.2021 № 28р-П.

административную поддержку проектной деятельности, межведомственное взаимодействие и координацию реализации проектов).

В соответствии с протоколом заседания проектного комитета от 14.12.2018 № 228/АПК (далее – Протокол № 228/АПК) руководителем Проектного комитета – Главой Республики Карелия утверждены паспорта 50 региональных проектов по 11 направлениям (национальным проектам (программам). В реализации мероприятий национального проекта «Наука», предусматривающего три федеральных проекта, Республика Карелия не участвует.

В течение 2019 года Республика Карелия дополнительно приступила к реализации мероприятий еще 4 федеральных проектов, паспорта которых не были утверждены в декабре 2018 года. Таким образом, общее количество федеральных проектов, согласованное Правительством Республики Карелия к реализации на территории республики, на 01.01.2020 составило 54 проекта.

По состоянию на 01.01.2020 в информационной системе проектной деятельности утверждены электронные версии 47 паспортов региональных проектов, по состоянию на 01.10.2020 и на 01.01.2021 – 48 паспортов региональных проектов.

Паспорта региональных проектов «Нормативное регулирование цифровой среды» (D1), «Новые возможности для каждого» (E7), «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (G9) утверждены Протоколом № 228/АПК, при этом в информационной системе проектной деятельности не размещены и в течение 2019-2020 годов данные проекты фактически не реализовывались.

Паспорта региональных проектов «Сохранение уникальных водных объектов» (G8) и «Ипотека» (F4), утвержденные Протоколом № 228/АПК, в информационной системе проектной деятельности также не размещены¹, при этом на территории республики осуществляется реализация мероприятий в части достижения установленных паспортами проектов показателей (в части G8 – проведение мероприятий по очистке участков прибрежной полосы водных объектов; в части F4 – предоставление гражданам государственной поддержки при улучшении жилищных условий с использованием займов на льготных основаниях, предоставление ипотечных жилищных кредитов (займов)).

Таким образом, в 2020 году на территории Республики Карелия осуществлялась реализация 50 региональных проектов по одиннадцати направлениям стратегического развития Российской Федерации, из них на реализацию отдельных мероприятий 29 региональных проектов предусматривалось финансовое обеспечение за счет средств бюджета Республики Карелия².

Из указанного количества региональных проектов (50), реализуемых в 2020 году в Республике Карелия, показатели 15 проектов в полном объеме интегрированы в государственные программы Республики Карелия, 23 проекта –

¹ По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия показатели по проектам «Сохранение уникальных водных объектов», «Ипотека» не установлены, целевые средства бюджета на реализацию проекта не предусмотрены, в связи с чем в ГИИС «Электронный бюджет» паспорта не размещены.

² Подробная информация отражена в вопросе 1.3 настоящего отчета.

частично, показатели 12 региональных проектов не отражены в государственных программах¹.

Информация о региональных проектах, реализуемых на территории Республики Карелия в 2019-2020 годах, представлена в приложении 2 к настоящему отчету.

В ходе проводимой работы по корректировке национальных проектов, в том числе в рамках исполнения положений Указа № 474, реализация отдельных проектов (как самостоятельных) в 2020 году завершена.

Например, по информации Управления труда и занятости Республики Карелия² на федеральном уровне принято решение о завершении в 2020 году мероприятий федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» (L3) национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Мероприятия по повышению эффективности службы занятости с 2021 года будут предусмотрены в рамках национального проекта «Демография», реализация мероприятий по повышению квалификации работников предприятий не планируется.

По информации Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия³ мероприятия федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (I7) национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 01.01.2021 будут исполняться в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (I5).

С учетом принятых на федеральном уровне решений отдельные региональные проекты досрочно завершены 31.12.2020: отчеты о ходе реализации проектов «Поддержка семей, имеющих детей» (E3) и «Учитель будущего» (E5) национального проекта «Образование», проекта «Популяризация предпринимательства» (I8) национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проекта «Экспорт услуг» (T4) национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за 2020 год утверждены со статусом отчета «завершающий».

В целях реализации Указа № 204 распоряжением Главы Республики Карелия от 24.07.2018 № 421-р (далее – Распоряжение № 421-р) в проверяемом периоде (2019-2020 годы) были утверждены показатели, характеризующие реализацию Указа № 204 в Республике Карелия (на прогнозный период с 2019 по 2024 годы), определены ответственные за достижение данных показателей. Распоряжением Главы Республики Карелия от 17.03.2020 № 158-р Распоряжение № 421-р признано утратившим силу.

Кроме того, реализация мероприятий отдельных региональных проектов учтена в Планах мероприятий по реализации в Республике Карелия в 2019 году, 2020 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019, от 15.01.2020 (утверждены распоряжениями Правительства Республики Карелия от 11.04.2019 № 268р-П, от 20.02.2020 № 101р-П соответственно).

¹ Подробная информация отражена в пункте 1.2 настоящего отчета.

² Согласно письма от 23.11.2020 № 7255/14.1-30/УТЗ-и.

³ Согласно письма от 23.11.2020 №10543/03-01-11/МСХи.

Информация о комиссиях, рабочих группах (региональных, межведомственных), созданных в целях реализации региональных проектов и контроля за их исполнением.

В реализации национальных проектов (программ) участвует 12 органов исполнительной власти Республики Карелия (из 23 органов исполнительной власти Республики Карелия, входящих в структуру органов исполнительной власти Республики¹).

В большинстве случаев составы рабочих групп, образованных в целях организации деятельности по реализации региональных составляющих национальных проектов, утверждены ведомственными приказами соответствующих органов исполнительной власти Республики Карелия.

Рабочая проектная группа по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» образована в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 07.12.2018 № 782р-П.

Министерством культуры в рамках указанной работы также созданы ведомственные проектные офисы, проектные офисы:

приказом Министерства культуры Республики Карелия от 30.12.2019 № 560 «Об организации проектной деятельности в Министерстве культуры Республики Карелия по реализации региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)), обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Культура», образованы органы управления проектной деятельностью в Министерстве культуры Республики Карелия – ведомственные проектные офисы, утверждены их составы, определены администраторы региональных проектов;

на базе государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Министерство культуры Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, созданы проектные офисы по приоритетным направлениям региональной составляющей национального проекта «Культура», назначены руководители проектных офисов, утверждено примерное положение об организации деятельности проектного офиса (приказ от 31.01.2019 № 29).

В части контроля за реализацией на территории республики мероприятий по формированию комфортной городской среды распоряжением Главы Республики Карелия от 22.02.2017 № 92-р образована Межведомственная комиссия Республики Карелия по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (до 2019 года – приоритетного проекта).

Информация о рабочих группах, созданных в целях организации деятельности по реализации региональных проектов и контролю за их исполнением представлена в приложении 3 к настоящему отчету.

¹ Структура органов исполнительной власти Республики Карелия определена в соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 25.09.2017 № 107 «О структуре органов исполнительной власти Республики Карелия» (на 01.01.2021 – в редакции Указа Главы Республики Карелия от 21.12.2020 № 112, которым из структуры ОИВ РК исключено Министерство спорта Республики Карелия).

Информационная открытость.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления являются в том числе открытость, доступность, достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления.

Статьей 6 вышеуказанного закона установлено, что доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления может обеспечиваться в том числе следующими способами:

обнародование (опубликование) государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации (пункт 1);

размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» (пункт 2);

присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления (пункт 5).

В соответствии с частью 3 статьи 13, частью 6 статьи 14 Федерального закона № 8-ФЗ состав общедоступной информации, размещаемой государственными органами субъектов Российской Федерации в сети «Интернет», определяется соответствующими перечнями информации, которые утверждаются в порядке, определяемом субъектами Российской Федерации.

Статьей 2 Закона Республики Карелия от 05.12.2016 № 2075-ЗРК «О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных органов Республики Карелия, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определено, что перечни информации о деятельности Правительства Республики Карелия и иных органов исполнительной власти Республики Карелия, размещаемой в сети «Интернет», утверждаются постановлением Правительства Республики Карелия.

Во исполнение данных требований постановлением Правительства Республики Карелия от 23.06.2016 № 226-П «О порядке размещения информации о деятельности Правительства Республики Карелия и органов исполнительной власти Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» утверждены:

Перечень информации о деятельности Правительства Республики Карелия, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Перечень информации Правительства РК);

Перечень информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Перечень информации органов исполнительной власти РК).

Согласно Перечню информации Правительства Республики Карелия размещается в том числе следующая информация:

сведения о деятельности рабочих органов (координационных, консультативных органов), образуемых Главой Республики Карелия, Правительством Республики Карелия (перечень рабочих органов, положения о рабочих органах, состав рабочих органов) (пункт 4);

сведения об основных мероприятиях, проводимых Главой Республики Карелия, Правительством Республики Карелия (пункт 11).

Согласно Перечню информации органов исполнительной власти РК размещается в том числе следующая информация:

перечень государственных программ Республики Карелия, ответственным исполнителем, соисполнителем, участником которых является орган исполнительной власти Республики Карелия, в том числе основные сведения о результатах реализации государственных программ Республики Карелия, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на их выполнение ресурсов (пункт 13);

статистическая информация о деятельности органа исполнительной власти Республики Карелия (пункт 20).

Указанными Перечнями требование (обязательное условие) по размещению информации непосредственно о реализации на территории Республики Карелия национальных (региональных) проектов не установлено.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 01.07.2019 № 283-П официальным сайтом органов исполнительной власти Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определена государственная информационная система Республики Карелия «Официальный интернет-портал Республики Карелия» (<http://gov.karelia.ru>) (далее – интернет-портал), которая создана с целью повышения открытости органов исполнительной власти Республики Карелия, расширения возможностей доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, повышения качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам государственных услуг.

На интернет-портале в разделе «Национальные проекты» в анализируемом периоде публикуется информация о реализации региональных проектов в Республике Карелия.

В указанном разделе размещена информация по следующим направлениям (подразделам):

Новости;

Аналитическая информация;

Перечень регламентирующих документов;

Проектный комитет;

Региональный проектный офис;

Экспертная комиссия;

Национальные проекты;

Схема взаимодействия участников реализации национальных проектов на территории Республики Карелия;

Перечень техники, технологий, оборудования, необходимого для реализации национальных проектов (перечень продукции), размещенного на ГИСП.

Подраздел «Национальные проекты» содержит следующую информацию в разрезе каждого из 12 национальных проектов, предусмотренных Указом № 204: куратор проекта, перечень региональных проектов, входящих в состав

национального проекта, ключевые задачи национального проекта, паспорта региональных проектов, новости.

По национальному проекту «Наука» в разделе указано, что реализация данного проекта ведется без участия Республики Карелия.

В составе национального проекта «Жилье и городская среда» (F) указан региональный проект «Чистая вода», который в 2019-2020 годах входил в состав национального проекта «Экология» (и учитывался как проект G5 в составе национального проекта G), а с 2021 года будет отражаться как проект F5. Паспорт регионального проекта «Чистая вода» в уточненной редакции не размещен, указано, что «паспорт проекта разрабатывается» (и, соответственно, проект «Чистая вода» не учтен в составе национального проекта «Экология»).

В составе национального проекта «Образование» наряду с реализуемыми в 2019-2020 годах региональными проектами включен новый проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ, согласно размещенному паспорту срок реализации проекта: 01.01.2021-31.12.2024).

Подраздел «Аналитическая информация» содержит следующие сведения:

мониторинг реализации целей и показателей региональных проектов Республики Карелия, в котором по состоянию на 01.03.2021 размещена оперативная информация об исполнении за 2020 год (по предварительным данным и ведомственной статистике);

исполнение национальных проектов в части строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (по состоянию на 25.12.2020);

вкладку «Статистическая информация», со ссылкой на официальную статистическую информацию по показателям социально-экономического развития Российской Федерации, необходимым для мониторинга достижения показателей национальных проектов (сайт Федеральной службы государственной статистики);

вкладку «Финансовое обеспечение национальных проектов», со ссылкой на сайт Минфина Республики Карелия, на котором, начиная с данных по состоянию на 01.12.2019, ежемесячно размещается информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на реализацию национальных проектов, а также освоении указанных средств на 1 число каждого месяца, в том числе на 01.01.2020, 01.01.2021, на первые числа истекшего периода 2021 года.

Подраздел «Перечень регламентирующих документов» содержит нормативные документы Российской Федерации и Республики Карелия (с начала реализации мероприятий национальных проектов). Перечень, в том числе, содержит ссылки на Указ Президента от 19.07.2018 № 444, Постановление № 64-П в первоначальных (неактуальных) редакциях; ссылку на утративший силу документ (Распоряжение № 421-р); распоряжения Главы Республики Карелия об образовании проектного комитета, об образовании регионального проектного офиса размещены в первоначальных редакциях, при одновременном указании в соответствующих вкладках действующих составов комитета и офиса.

Кроме раздела «Национальные проекты» на интернет-портале размещен раздел «Комфортная городская среда и программа поддержки местных инициатив, ТОС», который содержит, в том числе, подраздел «Комфортная городская среда» - информацию о региональном проекте F2 «Формирование комфортной городской среды» (с направлениями «Новости»; «Реализация федерального проекта «Комфортная городская среда», со ссылкой на сайт Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, где размещена подробная (детальная) информация о реализации указанного проекта).

По результатам мониторинга информации, размещенной на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, установлено следующее.

1. Администрация Главы Республики Карелия

На официальном сайте Администрации Главы Республики Карелия <http://adm.gov.karelia.ru> размещен раздел «Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», в котором содержится информация о результатах региональных проектов (период, за который они были достигнуты, не указаны); также размещены слайды о реализации национального проекта в 2019 году.

По вопросу достаточности информированности населения по вопросам реализации национальных (региональных) проектов¹ Администрацией Главы Республики Карелия отмечено, что информация о реализации региональных проектов публикуется на официальном интернет-портале Республики Карелия gov.karelia.ru в разделах «Новости» и «Национальные проекты» в достаточном для информированности населения объеме.

2. Министерство здравоохранения Республики Карелия

На официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Карелия <http://zdrav.gov.karelia.ru> в разделе «Национальные проекты» размещены паспорта региональных проектов по национальным проектам «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отчеты (по установленной форме) о ходе реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» на 2020 год в части региональных проектов, участником которых является Министерство здравоохранения Республики Карелия, слайды о реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году.

Информация о достаточности по мнению Министерства здравоохранения Республики Карелия информированности населения по вопросам реализации национальных (региональных) проектов не представлена.

3. Министерство культуры Республики Карелия

На официальном сайте Министерства культуры Республики Карелия <http://culture.gov.karelia.ru> в разделе «Национальный проект «Культура» размещены паспорта региональных проектов; План мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Республике Карелия и отчет о его реализации в 2019 году; планы мероприятий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по достижению целевых показателей, соглашения между Министерством и органами местного самоуправления о намерениях по реализации региональной составляющей национального проекта «Культура»; новости; сведения о проектных офисах; отдельные сведения оперативного мониторинга по

¹ Здесь и далее в данном разделе используется информация органов исполнительной власти, представленная по запросу Контрольно-счетной палаты о достаточности (по мнению органа исполнительной власти) информированности населения по вопросам реализации национальных (региональных) проектов, а также о результатах проведенных исследований общественного мнения (при наличии).

достижению целевых показателей национального проекта «Культура» за 2019 год, I квартал и I полугодие 2020 года; нормативные документы (в том числе в действующих (первоначальных) редакциях; например, Постановление № 1288, Постановление № 64-П).

По вопросу достаточности информирования населения о реализации национальных (региональных) проектов Министерство культуры Республики Карелия сообщило следующее. Информация о реализации в Республике Карелия национального проекта «Культура» в течение 2019-2020 годов регулярно размещается на официальных интернет-ресурсах органов исполнительной власти (официальном интернет-портале Республики Карелия, сайте Министерства культуры Республики Карелия), в социальных сетях и в средствах массовой информации, в том числе на региональных телеканалах ГТРК «Карелия» и «САМПО ТВ 360°». Размещаемые материалы освещают не только факт завершения конкретного проекта (открытие модельной библиотеки, завершение поездок школьников по культурным туристским маршрутам, завершение повышения квалификации и пр.), но и этапы его реализации (анонсирование проекта, информация о подготовительных работах, закупках, ходе строительства, ремонта объектов и пр.), а также содержат комментарии участников и экспертов.

4. Министерство образования Республики Карелия

На официальном сайте Министерства образования Республики Карелия <http://minedu.gov.karelia.ru/> в разделе «Национальные проекты» размещена следующая информация: паспорта региональных проектов национального проекта «Образование»; План мероприятий для реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в 2019 году; отчетная информация: ежемесячные отчеты о реализации региональных проектов с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года включительно (за IV квартал 2020 года, в том числе за год, отчетность отсутствует); региональные нормативные правовые акты.

По информации Министерства образования Республики Карелия информационное сопровождение хода реализации национальных проектов в сфере образования осуществляется на официальном портале Министерства образования Республики Карелия (<http://minedu.gov.karelia.ru>), сайте ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» (<http://kiro-karelia.ru>), на портале профессиональных образовательных организаций (<http://spo.karelia.ru>), официальном сайте Регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Республике Карелия (<http://wsr-karelia.ru>), сайте ресурсного центра развития дополнительного образования Республики Карелия (<http://rovesnik.karelia.ru>), официальных сайтах организаций, подведомственных Министерству образования Республики Карелия, что, по мнению Министерства, является достаточным.

5. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

На официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия <http://ecology.gov.karelia.ru> в разделе «Национальный проект «Экология» (размещен в разделе «Об органе власти») представлены паспорта региональных проектов данного национального проекта, сведения об их реализации (за отдельные периоды 2019 и 2020 годов).

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия отмечено, что информация о реализации региональных проектов размещается в средствах массовой информации, на официальных страницах в социальных сетях и

находится в общем доступе, что является достаточным для информированности населения.

6. Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

На официальном сайте Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия <http://mcx.gov.karelia.ru> в разделе «Национальные проекты» (размещенном в разделе «Об органе власти») представлены сведения о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Отдельная информация (по мере ее подготовки) размещается в новостной ленте на указанном сайте. Так, материалы под названием «Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия подведены итоги реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» за 2020 год» размещены в новостной ленте 13.01.2021.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия сообщило о достаточности информирования населения по вопросам реализации курируемых региональных проектов.

7. Министерство социальной защиты Республики Карелия

На официальном сайте Министерства социальной защиты Республики Карелия <http://soc.gov.karelia.ru> в разделе «Национальный проект «Демография»» (размещен в разделе «Об органе власти») представлена информация о правовых актах, разработанных в рамках реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», ежемесячные отчеты (по установленной форме) о ходе их реализации (в том числе отчеты на 31.12.2020), содержащие, в том числе, информацию о достижении показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, а также об освоении финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий региональных проектов.

По вопросу информированности населения Министерство социальной защиты Республики Карелия сообщило, что вышеуказанный раздел («Национальный проект «Демография»») был создан в целях информационного сопровождения реализации курируемых региональных проектов. Также во исполнение пункта 3.3 выписки из Протокола заседания Правительства Республики Карелия от 21.03.2019 № 3¹ информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография», ежемесячно публикуется в новостных разделах на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, а также на страницах в социальной сети «ВКонтакте». Для информирования граждан о мероприятиях проектов в первую очередь используются социальные медиа: самые посещаемые паблики сети «ВКонтакте» - «Республика Карелия» с доступом к комментариям, что позволяет осуществлять коммуникации с гражданами в диалоговом режиме. Постоянными информационными партнерами по освещению мероприятий, реализуемых в рамках

¹ Согласно пункту 3.3 выписки из Протокола заседания Правительства Республики Карелия от 21.03.2019 № 3 органам исполнительной власти Республики Карелия поручено ежемесячно обеспечивать публикации о проводимой работе (результатах реализации национальных проектов) на Официальном интернет-портале Республики Карелия.

национального проекта «Демография», являются региональные представительства федеральных средств массовой информации - агентств ТАСС, РИА, Интерфакс. «Истории успеха» участников региональных проектов освещаются в сюжетах ГТРК «Вести Карелии» и телекомпании «САМПО ТВ 360°».

8. Министерство спорта Республики Карелия¹

На официальном сайте Министерства спорта Республики Карелия <http://sport.gov.karelia.ru> в разделе «Спорт – норма жизни» размещена следующая информация: паспорт регионального проекта «Спорт – норма жизни» (с изменениями на сентябрь 2020 года); План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году, приказ о составе рабочей группы по реализации регионального проекта на 2019 год (актуальные документы в части 2020 года не представлены); ежемесячные отчеты (по установленной форме) о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» за 2019-2020 годы в том числе на 31.12.2020; серия видеороликов об отдельных видах спорта и действующих спортсменах Республики Карелия.

В новостной ленте на официальном сайте 12.01.2021 представлены итоги реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в Карелии в 2020 году.

По информации Министерства спорта Республики Карелия сведения о реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» публикуются в новостных разделах на официальном сайте Министерства спорта Республики Карелия, а также на страницах в социальной сети «ВКонтакте».

9. Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия

На официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия <http://economy.gov.karelia.ru> в разделе «Актуальные темы» отражено, что Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелии ведётся работа по 3 направлениям: Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы; Производительность труда и поддержка занятости; Международная кооперация и экспорт.

В разделе «Реализация национальных проектов» (размещен в разделе «Об органе власти», «Деятельность») представлены слайды по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт»; итоги реализации региональных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году (также в виде слайдов).

В разделе «Стратегическое планирование» подразделе «Проектное управление» размещены паспорта региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (5 проектов), «Международная кооперация и экспорт» (3 проекта). В данном разделе размещены отдельные нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Республики Карелия по вопросам проектного управления.

¹ В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 21.12.2020 № 616-П Министерство спорта Республики Карелия упразднено, Министерство образования Республики Карелия преобразовано в Министерство образования и спорта Республики Карелия.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия сообщило о достаточности информированности населения по вопросам реализации региональных проектов.

10. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

На официальном сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия <http://energy.gov.karelia.ru> размещена информация о национальных проектах «Жилье и городская среда», «Экология».

В части национального проекта «Экология» представлен паспорт регионального проекта «Чистая вода». Информация о реализации данного регионального проекта за анализируемый период на официальном сайте Министерства отсутствует.

В части национального проекта «Жилье и городская среда» представлены паспорта региональных проектов «Жилье», «Ипотека», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды».

Раздел «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» содержит следующие сведения: нормативные правовые акты Министерства о региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - программа расселения); перечень аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и включенных в программу расселения; количество квартир, возможных к расселению в 2020 году в разрезе населенных пунктов; информацию для граждан о программе расселения; рейтинг муниципальных образований республики по реализации мероприятий I и II этапов программы расселения на 15.05.2020.

Раздел «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» содержит: Дорожную карту по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019-2022 годы; нормативные правовые акты Республики Карелия и Министерства в части реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»; презентацию по проекту за 2018-2019 годы; отчеты о достижении значений показателей результативности за 2019 год; соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на 2019 год; сведения о работе Межведомственной комиссии Республики Карелия по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2019-2020 годы; информацию о реализованных проектах (пообъектно) за 2019-2020 годы.

Информация о реализации региональных проектов «Жилье», «Ипотека» за анализируемый период на официальном сайте Министерства отсутствует.

Министерством указано, что на регулярной основе на сайтах Правительства Республики Карелия и Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия размещается информация о ходе реализации региональных проектов, кроме того информация размещается в социальных сетях. По мнению Министерства, информированность населения по вопросам реализации региональных проектов достаточна.

11. Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

На официальном сайте Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия <http://road.gov.karelia.ru> в разделе «Реализация

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Карелия» представлена следующая информация: паспорт регионального проекта в целях реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (с пояснительной запиской к проекту, аналитической запиской о планируемых мероприятиях, направленных на расширение использования новых технологий и материалов в рамках проекта); карты-схема участков автомобильных дорог регионального значения Республики Карелия, которые планируется привести в нормативное состояние в период 2019-2024 годов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», карты-схемы предстоящих работ на региональных дорогах и дорогах Петрозаводской агломерации; справочная информация о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; сведения об итогах реализации национального проекта в Республике Карелия в 2019 году; нормативные правовые акты Республики Карелия (в том числе утратившие силу, например, Распоряжение № 421-р или в недействующих редакциях, например, Распоряжение № 853р-П). Информация о региональном проекте «Безопасность дорожного движения» на сайте Министерства отсутствует.

По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия мер, направленных на информирование населения по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Карелия, достаточно.

12. Министерство финансов Республики Карелия

На сайте Министерства финансов Республики Карелия <http://minfin.karelia.ru> в разделе «Бюджет Республики Карелия», подразделе «Исполнение бюджета Республики Карелия», и далее – подразделе «Финансовое обеспечение национальных проектов» размещены ежемесячные сведения об объемах финансового обеспечения национальных проектов за счет средств бюджета Республики Карелия и кассовом исполнении указанных расходов за 2019-2020 годы и за истекший период 2021 года (<http://minfin.karelia.ru/finansovoe-obespechenie-nacional-nyh-proektov>).

Таким образом, представленная на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия информация не является единой по содержанию и комплексной. Кроме того, поиск информации, размещенной не на главной странице сайта органа, может вызвать у пользователей (интересующихся граждан) определенные затруднения.

В целях информационного сопровождения реализации региональных проектов на территории Республики Карелия основная часть органов исполнительной власти Республики Карелия ограничивается размещением нормативных правовых актов, паспортов региональных проектов (в том числе в первоначальных, неактуальных на текущую дату), отчетов о ходе их реализации (по установленной форме). При этом, у большинства органов исполнительной власти Республики Карелия по состоянию на 01.03.2021 материалы о результатах реализации национальных проектов по итогам за 2020 год в целом отсутствуют.

Указанные факты не способствуют прозрачности и открытости информации о каждом из реализуемых на территории Республики Карелия региональном проекте для граждан и общественности,

У ряда органов исполнительной власти, предоставляющих в рамках реализации мероприятий региональных проектов средства из бюджета Республики

Карелия бюджетам муниципальных образований республики, информация не отражена в привязке к конкретному муниципальному району (муниципальному образованию), на территории которого реализуются соответствующие мероприятия, что, по мнению Контрольно-счетной палаты, не является достаточно информативным для населения (граждан).

Исследования общественного мнения о реализации региональных проектов в анализируемом периоде органами исполнительной власти Республики Карелия не проводились.

Наряду с этим, всеми органами исполнительной власти отмечено о достаточности информирования граждан о ходе реализации национальных проектов в Республике Карелия.

Информация об имеющихся (по мнению органов исполнительной власти Республики Карелия) проблемах нормативного правового регулирования, а также организационного и финансового характера по вопросам реализации национальных (региональных) проектов, о необходимости внесения изменений в действующий порядок, регулирующий процедуру формирования, корректировки и исполнения национальных (региональных) проектов.

По информации органов исполнительной власти Республики Карелия, представленной в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия, в отдельных сферах имеются вопросы, требующие проработки и урегулирования.

По отдельным проектам по состоянию на 01.01.2021 не решены вопросы корректировки показателей, установленных на 2020-2024 годы.

Так, Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия сообщено, что поскольку основу экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Карелия составляет добываемая в Атлантическом океане и Баренцевом море рыба, ракообразные и производимая из них рыбная продукция, достижение показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на период до 2024 года находится в прямой зависимости от обеспеченности предприятий рыбохозяйственного комплекса квотами на вылов экспортно-ориентированных видов водных биологических ресурсов (трески и пикши). Для обеспечения выполнения показателей данного федерального проекта полагается целесообразным предусмотреть механизм корректировки установленных субъектам Российской Федерации показателей по объему экспорта продукции АПК на отчетный год с учетом фактического наделения рыбодобывающих предприятий квотами на вылов ключевых объектов экспорта. В целях необходимости урегулирования данного вопроса в адрес Минсельхоза России направлены обращение Правительства Республики Карелия, совместное обращение губернаторов субъектов Российской Федерации (Республика Карелия, Мурманская и Архангельская области)¹.

Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в отчетном году инициировано рассмотрение вопроса корректировки показателей «доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», «доля городского населения Российской Федерации,

¹ Письма от 15.10.2020 № 12119/02-09/Аи, от 13.01.2021 № 143/02-09/Аи соответственно.

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлены обращения Правительства Республики Карелия¹. По результатам рассмотрения Минстроем России сообщено, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет принято решение о корректировке показателей федерального проекта.

Администрацией Главы Республики Карелия, курирующей региональные проекты в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», высказано мнение о необходимости при формировании федеральных проектов соблюдения порядка установления значений декомпозированных на субъекты Российской Федерации показателей федеральных проектов с учетом их возможности достижения в субъектах Российской Федерации, разработки и принятия согласованных с субъектами Российской Федерации методик расчета показателей.

Вопросы наличия дополнительной потребности в ассигнованиях из федерального бюджета обозначены Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, Министерством образования Республики Карелия.

Согласно информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия предусмотренный в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объем ассигнований из федерального бюджета бюджету Республики Карелия позволяет при ремонте автомобильных дорог в рамках нацпроекта обеспечить только выполнение работ по устройству выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия (средняя стоимость выполнения работ по ремонту одного километра автодороги составляет 12,0 млн рублей). Вместе с тем, существующее состояние автомобильных дорог требует выполнения работ по их капитальному ремонту с более высокой стоимостью (до 25,0 млн рублей за километр). В целях обеспечения возможности выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения, способствующих увеличению межремонтных сроков, требуется рассмотрение вопроса направления дополнительных объемов финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Дорожная сеть».

В отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом № 204, предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по Республике Карелия на 2019 год, на 2020 год утвержден распоряжениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р (на 2019 год и на

¹ Письма от 04.03.2020 № 2660/02-16/Аи, от 20.07.2020 № 8750/02-16/Аи, от 26.08.2020 № 10154/02-16/Аи, от 03.12.2020 № 14071/02-16/Аи.

плановый период 2020 и 2021 годов), от 18.10.2019 № 2468-р (на 2020–2024 годы) в размере 99,0 процента¹.

Министерством образования Республики Карелия в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» сообщено, что указанная позиция Правительства Российской Федерации для Республики Карелия подтверждена и при заключении соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета (необходимо придерживаться предельных уровней софинансирования 99 процентов). При этом фактические расходы Республики Карелия, прежде всего в части вводимых новых инфраструктурных объектов (школы, детские сады) в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» не соответствуют соотношению 99 на 1 процентов)

Так, стоимость строительства зданий общеобразовательных организации в г.Петрозаводске (микрорайон «Древлянка-6») мощностью 1 350 мест, в г.Кеми мощностью 1 200 мест, в пос.Деревянка, в г.Медвежьегорске в соответствии с заключенными государственными контрактами (либо разработанной проектной сметной документацией) составляет 4 250,3 млн рублей, при этом объем субсидии из федерального бюджета составляет 2 742,6 млн рублей (или 64,5 процента от стоимости). Таким образом, расходы бюджета Республики Карелия сверх объемов, установленных соглашением, на строительство указанных общеобразовательных организаций составили 1 465,2 млн рублей (средства, требуемые для соблюдения установленного уровня софинансирования из федерального бюджета (до 99 процентов)).

Расходы бюджета Республики Карелия на создание в Республике Карелия дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, сверх объемов, установленных за счет средств федерального бюджета, составляют 164,19 млн рублей.

Таким образом, фактические расходы бюджета Республики Карелия на создание на территории Республики Карелия объектов образования в части источников финансового обеспечения расходов не соответствуют установленным уровням софинансирования из федерального бюджета (имеется значительный недостаток ассигнований) и финансового обеспечения за счет средств бюджета (соответственно, значительное превышение установленного уровня).

Министерством финансов Республики Карелия отмечено, что Министерство, как финансовый орган, не имеет ежедневной информации о бюджетных обязательствах. Указанная информация предоставляется Министерству финансов Республики Карелия ежемесячно в форме отчета, не содержащего полного набора

¹ Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» установлено, что для субъектов Российской Федерации, в отношении которых в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации разрабатываются индивидуальные программы социально-экономического развития, предельный уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета также принимается равным 99 процентам.

информации, необходимой для размещения, и в формате, не соответствующем форматам ГИИС «Электронный бюджет».

Фактические значения ряда показателей отдельных региональных проектов по итогам года формируются на основе официальной статистической информации и публикуются согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р¹. Федеральной службе государственной статистики (далее - Росстат) и другим субъектами официального статистического учета предусмотрено обеспечить выполнение работ по формированию официальной статистической информации в соответствии с Федеральным планом статистических работ.

Отсутствие по состоянию на отчетные даты (в том числе на 01.01.2021) официальной статотчетности отмечено по отдельным показателям федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» (данные Росстата); федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» (данные Росстата); регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» (данные Росмолодежи); регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» (данные Росприроднадзора); регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (данные Минэкономразвития России).

Обобщенная информация об имеющихся проблемах нормативного правового регулирования, организационного, финансового характера по вопросам реализации национальных (региональных) проектов представлена в приложении 4 к настоящему отчету.

Также следует учитывать, что в соответствии с Указом № 474 на федеральном и региональном уровнях в настоящее время проводится работа по корректировке национальных проектов и соответствующих целевых показателей.

1.2. Взаимосвязь региональных проектов с документами стратегического планирования Республики Карелия.

В рамках выполнения Поручения № ДМ-П13-2858 и в соответствии с Положением к Постановлению № 64-П обеспечивалась интеграция национальных проектов в государственные программы с отражением в госпрограммах целей, задач и показателей региональных составляющих национальных проектов, а также объемов расходов на их реализацию² (в случае наличия ассигнований на финансовое обеспечение выполнения мероприятий).

¹ Пунктом 2.9 Федерального плана статистических работ предусмотрены Показатели социально-экономического развития Российской Федерации, необходимые для мониторинга достижения показателей национальных проектов, транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и федеральных проектов, входящих в их состав.

² Данные о расходах на реализацию региональных проектов в рамках государственных программ Республики Карелия представлены в пункте 1.3 настоящего отчета.

Приложением 5 «Соотношение целей и задач Стратегии, государственных программ Республики Карелия, а также национальных и федеральных проектов (программ)» к Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29.12.2018 № 899р-П (далее – Приложение 5 к Стратегии), определено возможное участие Республики Карелия в национальных и федеральных проектах в разрезе семи основных стратегических направлений.

Данные об отражении региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в документах стратегического планирования Республики Карелия (по состоянию на 31.12.2020) представлены в приложении 5 к настоящему отчету.

В ряде случаев региональные составляющие одного и того же национального проекта, в зависимости от специфики, отражены в нескольких государственных программах. Так, мероприятия регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» учтены в рамках госпрограмм «Развитие образования», «Содействие занятости населения», регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - в рамках госпрограмм «Развитие здравоохранения», «Развитие транспортной системы».

В ряде случаев в рамках одной госпрограммы предусматривается реализация мероприятий нескольких федеральных проектов. Так, в структуре госпрограммы «Развитие образования» учтены мероприятия федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» и федеральных проектов национального проекта «Образование», в госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» - мероприятия федеральных проектов национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Также в рамках госпрограмм фактически обеспечивается участие Республики Карелия в региональных проектах, не предусмотренных Приложением 5 к Стратегии (в части их взаимоувязки с конкретной госпрограммой).

Так, например, реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», мероприятий федеральных проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» - в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами».

При этом взаимосвязь указанных проектов и госпрограмм Приложением 5 к Стратегии не учтена.

И, наоборот, Приложением 5 к Стратегии учтена взаимосвязь региональных составляющих федеральных (национальных) проектов и госпрограмм, которая не отражена в паспортах проектов. Например, паспортом регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного

здоровья») не предусмотрена взаимосвязь с госпрограммой «Развитие физической культуры и спорта», отраженная в Приложении 5 к Стратегии; паспортами региональных проектов «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Экспорт услуг» - взаимосвязь с госпрограммой «Экономическое развитие и инновационная экономика», и др.

В целях анализа соответствия показателей региональных проектов показателям государственных программ Республики Карелия проведен анализ паспортов региональных проектов, отчетов о ходе реализации региональных проектов, государственных программ Республики Карелия и отчетов о ходе реализации госпрограмм по итогам их исполнения за 2019 год и за 9 мес.2020 года (в части государственных программ учтены данные отчетов об исполнении планов реализации госпрограмм по состоянию на 01.10.2020).

2019 год

Для сопоставления наименований целевых показателей, плановых и фактических значений показателей (включая показатели с «нулевыми» значениями) проведен анализ 47 паспортов региональных проектов и отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.01.2020 (в рамках 10 национальных проектов), государственных программ и годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Карелия (приложение 6 к настоящему отчету). В результате установлено следующее.

В соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.01.2020 из 199 целевых показателей (включая 36 показателей, значения которых на 2019 год не установлены), только 81 показатель¹ (или 40,7 процента) отражены в государственных программах Республики Карелия (как целевой показатель, показатель результативности или показатель непосредственного результата).

В государственных программах:

полностью отражены показатели 12 региональных проектов (25,6 процента от проанализированного количества региональных проектов (47)): «Культурная среда» (А1, 2 показателя), «Поддержка семей, имеющих детей» (Е3, 2), «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (Е6, 4), «Социальная активность» (Е8, 4), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3, 2), «Чистая вода» (G5, 2), «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (I4, 1), «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (I7, 4), «Популяризация предпринимательства» (I8, 4), «Развитие экспорта медицинских услуг» (N8, 1), «Безопасность дорожного движения» (R3, 1), «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (T2, 4 показателя);

частично отражены показатели 25 регионального проекта (53,2 процента от проанализированного количества региональных проектов): «Творческие люди» (А2, из 3 показателей в госпрограмме отражен 1 показатель), «Информационная безопасность» (D4, из 2 отражен 1), «Цифровое государственное управление» (D6,

¹ С учетом показателей госпрограмм, которые требуют корректировки формулировок и единиц измерения (в целях четкого соответствия показателям, установленным региональными проектами).

из 4 отражен 1), «Современная школа» (Е1, из 4 отражен 1), «Успех каждого ребенка» (Е2, из 5 отражены 3), «Цифровая образовательная среда» (Е4, из 5 отражен 1), «Учитель будущего» (Е5, из 3 отражен 1), «Жилье» (F1, из 2 отражен 1), «Формирование комфортной городской среды» (F2, из 7 отражены 4), «Ипотека» (F4, из 2 отражен 1), «Чистая страна» (G1, из 3 отражен 1), «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (G2, из 4 отражен 1), «Сохранение уникальных водных объектов» (G8, из 4 отражены 3), «Сохранение лесов» (GA, из 6 отражены 3), «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (I5, из 3 отражены 2), «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (N1, из 10 отражены 4), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (N3, из 4 отражены 3), «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (N4, из 10 отражены 3), «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (N5, из 7 отражены 5), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (N7, из 25 отражены 2), «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (P2, из 5 отражен 1), «Старшее поколение» (P3, из 4 отражен 1), «Спорт – норма жизни» (P5, из 5 отражены 3), «Дорожная сеть» (R1, из 4 отражены 2), «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (R2, из 4 показателей отражен 1 показатель);

не отражены показатели 10 региональных проектов (21,2 процента от проанализированного количества региональных проектов): «Цифровая культура» (A3, 1), «Информационная инфраструктура» (D2, 4), «Кадры для цифровой экономики» (D3, 2), «Цифровые технологии» (D5, 1), «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (I1, 1), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (N2, 7), «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (P1, 3), «Укрепление общественного здоровья» (P4, 3), «Экспорт услуг» (T4, 9), «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (T6, 2).

Проведен анализ отражения в государственных программах результатов 10 региональных проектов, целевые показатели которых не включены в госпрограммы (приложение 7 к настоящему отчету).

Паспортами шести из указанных региональных проектов («Цифровая культура» (A3), «Информационная инфраструктура» (D2), «Кадры для цифровой экономики» (D3), «Цифровые технологии» (D5), «Укрепление общественного здоровья» (P4), «Экспорт услуг» (T4)), показатели которых не отражены в госпрограммах, значения результатов выполнения задач региональными проектами на 2019 год не установлены.

Паспортом регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (I1) из перечня задач на 2019 год установлены значения результатов по двум задачам («реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата», «увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Карелия»), в соответствующих госпрограммах (планах реализации об исполнении госпрограмм) данные задачи (результаты) не отражены.

Паспортом регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (T6) при отсутствии в госпрограмме

предусмотренных проектом показателей учтено мероприятие «участие компаний-экспортеров в региональном этапе конкурса «Экспортер года» в Республике Карелия», соответствующее одной из задач проекта.

Реализация двух из указанных десяти проектов осуществлялась с финансовым обеспечением расходов за счет средств бюджета Республики Карелия (средств федерального бюджета):

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (N2):

- в составе 7 показателей регионального проекта установлены показатели «смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, чел.», «смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, чел.», при этом в госпрограмме в рамках реализации мероприятий проекта N2 предусмотрен показатель «смертность от болезней системы кровообращения», что не соответствует показателям проекта (приложение 6 к отчету);

- из двух задач и результатов регионального проекта ни одна не отражена в госпрограмме как мероприятие или ожидаемый непосредственный результат (приложение 7 к отчету);

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (P1) – ни один из трех показателей регионального проекта не отражен в госпрограмме; в части установленных пяти задач (результатов) регионального проекта требуется корректировка наименований и единиц измерения по мероприятиям (ожидаемым непосредственным результатам) госпрограммы, при этом, только по одной из задач проекта «семьи, имеющие трех и более детей, получили региональный материнский (семейный) капитал, тыс. семей» плановое значение (1,2 тыс. семей) соответствует ожидаемому непосредственному результату мероприятия госпрограммы (1 200 чел.), с учетом сопоставимости единиц измерения (приложения 6, 7 к отчету).

По результатам проведенного анализа Контрольно-счетная палата отмечает наличие в ряде случаев отклонений в плановых и фактических значениях, отраженных в региональных проектах и государственных программах. Отдельные примеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование национальных проектов	Наименование госпрограмм Республики Карелия	Показатель регионального проекта (2019 год)				Показатель Госпрограммы (2019 год)		Отклонение значений показателей Госпрограммы от Проекта	
		наименование	план	факт	примечание	план	факт	план	факт
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)	Развитие образования	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	-	-	паспортом установлено плановое значение "12"	12,0	12,0	-12,0	-12,0
		Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1,43	1,43	паспортом установлено плановое значение "2"	2,0	2,0	0,57	0,57

Наименование национальных проектов	Наименование госпрограмм Республики Карелия	Показатель регионального проекта (2019 год)				Показатель Госпрограммы (2019 год)		Отклонение значений показателей Госпрограммы от Проекта	
		наименование	план	факт	примечание	план	факт	план	факт
Социальная активность	Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	14,0	14,0	х	10,0	14,0	-4,0	0,0
		Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, %	30,0	30,0	х	10,0	30,0	-20,0	0,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Обеспечение доступным и комфортным жильем и ЖКУ	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.м.кв.	2,63	2,63	х	3,00	6,46	0,37	3,83
		Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек	150,0	150,0	х	178,0	348,0	28,0	198,0

2020 год

Для сопоставления наименований целевых показателей, плановых и фактических значений данных показателей (показатели с установленными значениями и «нулевые») проведен анализ 50 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов (на основании 48 отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.10.2020, а также паспортов региональных проектов «Сохранение уникальных водных объектов» и «Ипотека», которые не размещаются в информационной системе проектной деятельности), государственных программ и отчетов по исполнению планов реализации государственных программ за 9 месяцев 2020 года. В результате установлено следующее (приложение 8 к настоящему отчету).

В соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.10.2020 из 229 целевых показателей, отраженных в отчетах¹ (в том числе 33 показателя, значения которых на 2020 год не установлены), только 88 показателей² (38,4 процента) учтены в государственных программах Республики Карелия (как целевой показатель, показатель результативности или показатель непосредственного результата).

В государственных программах:

полностью отражены показатели 15 региональных проектов (30,0 процента от проанализированного количества региональных проектов (50)): «Поддержка семей, имеющих детей» (Е3, 2 показателя), «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (Е6, 4), «Социальная активность» (Е8, 4), «Жилье» (F1, 2), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3, 2), «Чистая вода» (G5, 2), «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (I4, 1),

¹ В данном случае при анализе учтены показатели, указанные исключительно в отчетах на 01.10.2020. Фактически число показателей в паспортах региональных проектов на 2020 год, а также в отчетах по итогам 2020 года (по состоянию на 01.01.2021) выше указанного (229) количества показателей.

² С учетом показателей госпрограмм, которые требуют корректировки формулировок и единиц измерения (в целях соответствия показателям, установленным региональными проектами).

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (I5, 2), «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (I7, 4), «Популяризация предпринимательства» (I8, 4), «Системные меры по повышению производительности труда» (L1, 2), «Развитие экспорта медицинских услуг» (N8, 1), «Спорт – норма жизни» (P5, 5), «Безопасность дорожного движения» (R3, 1), «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (T2, 4);

частично отражены показатели 23 региональных проектов (46,0 процента от проанализированного количества региональных проектов): «Культурная среда» (A1, из 3 показателей отражены 2), «Творческие люди» (A2, из 3 отражен 1), «Информационная безопасность» (D4, из 2 отражен 1), «Цифровое государственное управление» (D6, из 4 отражены 2), «Современная школа» (E1, из 4 отражен 1), «Успех каждого ребенка» (E2, из 5 отражены 2), «Цифровая образовательная среда» (E4, из 5 отражен 1), «Учитель будущего» (E5, из 3 отражен 1), «Формирование комфортной городской среды» (F2, из 8 отражены 7), «Ипотека» (F4, из 2 отражен 1), «Чистая страна» (G1, из 3 отражен 1), «Сохранение уникальных водных объектов» (G8, из 4 отражен 1), «Сохранение лесов» (GA, из 6 отражены 3), «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (L2, из 7 отражен 1), «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» (L3, из 5 отражены 2), «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (N1, из 9 отражены 3), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (N3, из 3 отражены 2), «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (N4, из 10 отражены 3), «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (N5, из 7 отражены 5), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (N7, из 40 отражен 1), «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (P2, из 5 отражены 2), «Старшее поколение» (P3, из 5 отражен 1), «Дорожная сеть» (R1, из 4 отражены 2);

не отражены показатели 12 региональных проектов (24,0 процента от проанализированного количества региональных проектов): «Цифровая культура» (A3, 1), «Информационная инфраструктура» (D2, 4), «Кадры для цифровой экономики» (D3, 2), «Цифровые технологии» (D5, 1), «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (G2, 4), «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (I1, 1), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (N2, 7), «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (P1, 6), «Укрепление общественного здоровья» (P4, 3), «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (R2, 2), «Экспорт услуг» (T4, 9), «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (T6, 2).

Проведен анализ отражения в государственных программах результатов 14 региональных проектов, целевые показатели которых не включены в госпрограммы (приложение 9 к настоящему отчету).

Паспортами четырех из указанных региональных проектов («Цифровая культура» (A3), «Информационная инфраструктура» (D2), «Кадры для цифровой экономики» (D3), «Цифровые технологии» (D5)) показатели которых не отражены в госпрограммах, значения результатов выполнения задач региональными проектами на 2020 год не установлены.

Паспортами региональных проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (П1), «Укрепление общественного здоровья» (Р4), «Экспорт услуг» (Т4) по отдельным задачам на 2020 год установлены значения результатов, в соответствующих госпрограммах (планах реализации об исполнении госпрограмм) задачи (результаты) не отражены.

Паспортом регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Т6) значения результата «количество компаний-экспортеров, принявших участие в региональном этапе конкурса «Экспортер года» в Республике Карелия» региональным проектом на 2020 год не установлено, вместе с тем, отчетом об исполнении плана реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» плановое значение показателя определено в объеме 11 единиц (факт на 01.10.2020 – 0 ед.).

Реализация четырех из указанных двенадцати проектов осуществлялась с финансовым обеспечением расходов за счет средств бюджета Республики Карелия (средств федерального бюджета):

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (G2) - ни один из четырех показателей регионального проекта не отражен в госпрограмме; в части установленных трех задач (результатов) регионального проекта одна соответствует, но требует корректировки наименования;

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (N2) – из шести задач (результатов) регионального проекта ни одна не отражена в госпрограмме как мероприятие или ожидаемый непосредственный результат (приложение 9 к отчету);

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Р1) - ни один из шести показателей (все из них - демографические) регионального проекта не отражен в госпрограмме; из четырех задач и результатов регионального проекта три направления предусмотрены в госпрограмме (в части данного проекта Контрольно-счетная палата отмечает, что с 2021 года демографические показатели из регионального проекта Р1 исключены в полном объеме);

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (R2) - из двух задач и результатов регионального проекта один соответствует данным госпрограммы.

Также установлено наличие в ряде случаев отклонений в плановых и фактических значениях, отраженных по итогам исполнения региональных проектов и государственных программ за 9 месяцев 2020 года. Отдельные примеры представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование национальных проектов	Наименование государственных программ Республики Карелия	Показатель по отчету на 01.10.2020			Показатель по плану реализации Госпрограммы и госпрограмме		Отклонение значений показателей Госпрограммы от Проекта	
		наименование	План на 2020 год	Факт на 01.10.2020	план	факт на 01.10.2020	план	факт
Культурная среда	Развитие культуры	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	13,0	5,0	8,0	0,0	-5,0	-5,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Обеспечение доступным и комфортным жильем и ЖКУ	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом	18,78	18,78	18,778	24,290	-0,002	5,510
		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом	1,03	1,03	1,123	1,430	0,093	0,400

Наименование национальных проектов	Наименование государственных программ Республики Карелия	Показатель по отчету на 01.10.2020			Показатель по плану реализации Госпрограммы и госпрограмме		Отклонение значений показателей Госпрограммы от Проекта	
		наименование	План на 2020 год	Факт на 01.10.2020	план	факт на 01.10.2020	план	факт
Старшее поколение	Содействие занятости населения	Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)	289,0	749,0	150,0	170,0	-139,0	-579,0

1.3. Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации региональных проектов, сравнительный анализ расходов по итогам их исполнения в 2019-2020 годах.

В соответствии с паспортами региональных проектов, размещенными в информационной системе проектной деятельности (в ГИИС «Электронный бюджет») по состоянию на 31.12.2020, общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий региональных составляющих федеральных (национальных) проектов, предусмотренный паспортами региональных проектов на период с 2019 по 2024 годы, по состоянию на 01.01.2021 составляет 53 232,07 млн рублей (с учетом бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, средств местных бюджетов), в том числе на 2019 год - 8 239,23 млн рублей, на 2020 год - 11 821,74 млн рублей.

Согласно пункту 5 Положения к Постановлению № 64-П планирование бюджетных ассигнований на реализацию региональных составляющих национальных проектов на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Республики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, проектов решений о бюджетах муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период, актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований; финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам реализации должно отражаться в разрезе источников финансового обеспечения с выделением, в том числе объемов межбюджетных трансфертов.

В целях обособления бюджетных ассигнований на реализацию региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в законе о бюджете Республики Карелия расходы отражены по обособленным кодам целевых статей расходов бюджета Республики Карелия с применением буквенного обозначения на уровне основного мероприятия соответствующей государственной программы Республики Карелия (4-5 разрядов кода целевой статьи, предполагающих уникальный буквенный код национального проекта и номер федерального проекта). Тем самым обеспечивается возможность контроля за использованием бюджетных средств на реализацию национальных проектов, как структурных элементов государственных программ.

Законом Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред.

Закона Республики Карелия от 26.12.2019 № 2444-ЗРК; далее – Закон о бюджете на 2019 год) в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий 30 федеральных проектов в рамках восьми национальных проектов с общим объемом ассигнований в сумме 8 045 059,9 тыс. рублей, или 14,7 процента от общего планового объема расходов бюджета Республики Карелия на 2019 год (54 913 072,9 тыс. рублей).

Законом Республики Карелия от 19.12.2019 № 2440-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. Закона Республики Карелия от 11.12.2020 № 2524-ЗРК; далее – Закон о бюджете на 2020 год) в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий 29 федеральных проектов в рамках девяти национальных проектов с общим объемом ассигнований в сумме 11 488 246,4 тыс. рублей, или 15,7 процента от общего планового объема расходов бюджета Республики Карелия на 2020 год (73 331 490,9 тыс. рублей).

В сравнении с 2019 годом Законом о бюджете на 2020 год предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов «Безопасность дорожного движения», «Социальная активность» и «Ипотека».

Региональные проекты в рамках национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» реализуются без финансового обеспечения.

Между федеральными органами власти (в лице руководителей федеральных проектов) и Правительством Республики Карелия (руководителями региональных проектов) заключены:

соглашения о предоставлении субсидий или иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (бюджету Республики Карелия);

соглашения о реализации на территории Республики Карелия региональных проектов в целях организации взаимодействия сторон при их реализации и осуществления мониторинга реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Республике Карелия и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории республики.

Как указано в пункте 1.1 настоящего отчета предельный уровень софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации региональных проектов, по Республике Карелия на 2019-2024 годы установлен в размере 99,0 процента, минимальная доля финансового обеспечения расходного обязательства за счет средств региона в течение указанного периода составляет 1,0 процент.


В целях реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» между Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд) и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия заключены соглашения о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет

средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в общем объеме ассигнований за счет средств федерального бюджета средства Фонда учтены для предоставления бюджетам муниципальных образований Республики Карелия в 2019 году - в сумме 317 065,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 1 198 876,7 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2021 уточненный плановый объем ассигнований на реализацию в 2020 году мероприятий в рамках федеральных (национальных) проектов за счет бюджетных средств составил 11 706 098,5 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 7 964 965,1 тыс. рублей или 68,0 процента от общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели).

По сравнению с первоначально утвержденными на реализацию национальных проектов бюджетными ассигнованиями на 2020 год уточненный объем финансового обеспечения расходов на указанные цели в течение года возрос на 1 832 759,9 тыс. рублей, или на 18,6 процента, что связано с увеличением объемов расходов и за счет средств федерального бюджета (на 28,2 процента) и за счет средств бюджета Республики Карелия (на 2,2 процента). Данные в разрезе национальных проектов приведены на рисунке 1.

Рисунок 1
(млн рублей)

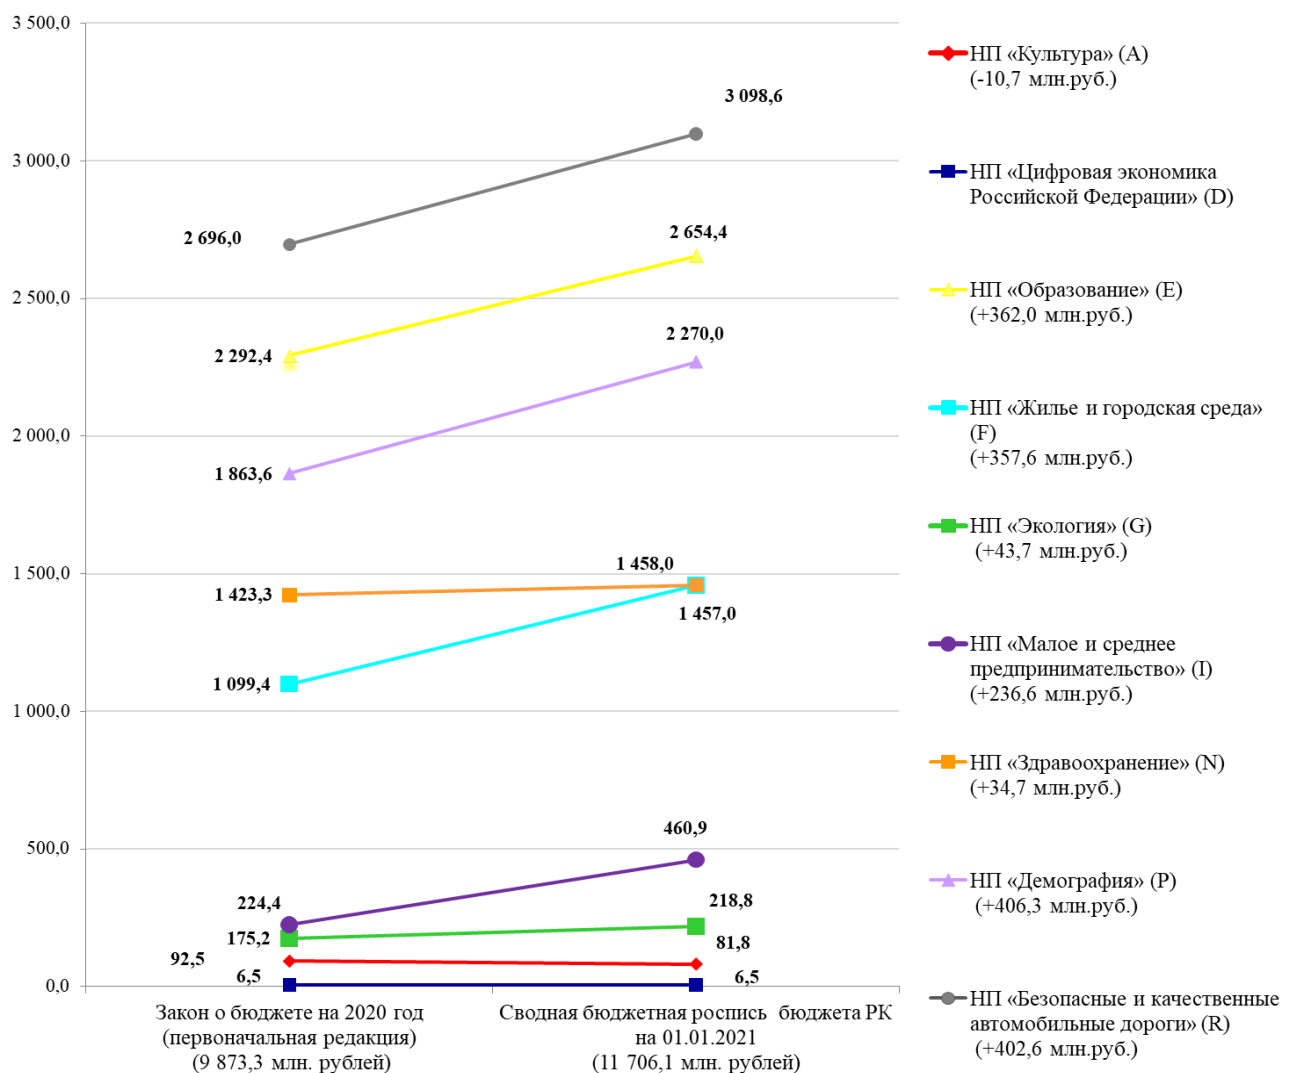

В 2019 году наибольший объем бюджетных ассигнований на национальные проекты предусмотрен на реализацию национальных проектов: «Демография» (26,9 процента от общего объема расходов на реализацию национальных проектов соответственно) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (32,3 процента от общего объема расходов на реализацию национальных проектов).

На 2020 год около половины бюджетных ассигнований на национальные проекты предусмотрено на реализацию двух национальных проектов: «Образование» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», или 22,7 и 26,5 процента соответственно от общего объема расходов на реализацию национальных проектов.

Расходы на реализацию мероприятий федеральных (национальных) проектов за 2019 год составили 7 117 023,1 тыс. рублей (14,2 процента от общих расходов бюджета Республики Карелия), или 87,8 процента от планового объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 01.01.2020 (далее – сводная бюджетная роспись на 01.01.2020), в том числе за счет средств федерального бюджета (с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 5 326 984,3 тыс. рублей, средств бюджета Республики Карелия – 1 790 038,8 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий региональных проектов за 2020 год составили 9 989 966,0 тыс. рублей (14,8 процента от общих расходов бюджета Республики Карелия), или 85,3 процента от планового объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по состоянию на 01.01.2021 (далее – сводная бюджетная роспись на 01.01.2021), в том числе за счет средств федерального бюджета (с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 6 708 506,4 тыс. рублей, средств бюджета Республики Карелия – 3 281 459,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий федеральных (национальных) проектов за 2020 год в сравнении с 2019 годом увеличились на 2 872 942,9 тыс. рублей (или на 40,4 процента).

Укрупненные данные об исполнении расходов представлены в таблице 3.

Таблица 3
(млн рублей)

Код	Национальный проект (программа)	Исполнено на 01.01.2020	Исполнено на 01.10.2020	План на 2020 год					Исполнено на 01.01.2021					% исполнения
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				
					За счет средств ФБ	Уд. вес	За счет средств РК	Уд. вес		За счет средств ФБ	Уд. вес	За счет средств РК	Уд. вес	
A	«Культура»	39,09	64,70	81,79	80,64	98,6	1,15	1,4	67,95	67,37	99,1	0,58	0,9	83,1
D	«Цифровая экономика Российской Федерации»	0,0	0,00	6,53	6,46	99,0	0,07	1,0	6,53	6,46	99,0	0,07	1,0	100,0
E	«Образование»	410,74	500,76	2 654,41	1 889,95	71,2	764,46	28,8	1 279,46	900,99	70,4	378,47	29,6	48,2
F	«Жилье и городская среда»	453,81	681,76	1 457,03	1 427,74	98,0	29,29	2,0	1 337,34	1 310,27	98,0	27,07	2,0	91,8
G	«Экология»	150,16	94,14	218,84	166,83	76,2	52,01	23,8	210,00	166,83	79,4	43,17	20,6	96,0
I	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной»	1 010,98	458,38	460,94	384,38	83,4	76,56	16,6	460,94	384,38	83,4	76,56	16,6	100,0

К о д	Национальный проект (программа)	Испол- нено на 01.01.2020	Испол- нено на 01.10.2020	План на 2020 год					Исполнено на 01.01.2021					% испол- нения
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				
					За счет средств ФБ	Уд. вес	За счет средств РК	Уд. вес		За счет средств ФБ	Уд. вес	За счет средств РК	Уд. вес	
	предпринимательс кой инициативы»													
N	«Здравоохранение»	749,15	1 083,00	1 457,95	1 092,72	74,9	365,23	25,1	1 457,95	1 092,72	74,9	365,23	25,1	100,0
P	«Демография»	1 691,21	1 059,77	2 269,99	1 907,66	84,0	362,33	16,0	2 103,15	1 770,95	84,2	332,20	15,8	92,7
R	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	2 611,88	1 633,80	3 098,62	1 008,58	32,5	2 090,04	67,5	3 066,65	1 008,54	32,9	2 058,11	67,1	99,0
	Всего	7 117,02	5 576,31	11 706,10	7 964,97	68,0	3 741,13	32,0	9 989,97	6 708,51	67,2	3 281,46	32,8	85,3


В 2020 году расходы за счет средств федерального бюджета составили 67,2 процента от общего объема бюджетных расходов на указанные цели, за счет средств бюджета Республики Карелия – 32,8 процента (в 2019 году - за счет средств федерального бюджета - 74,8 процента от общего объема бюджетных расходов на указанные цели, за счет средств бюджета Республики Карелия – 25,2 процента).

Анализ расходов бюджета Республики Карелия на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов в разрезе источников финансового обеспечения за 2019 год, за 2020 год приведен в приложениях 10, 11 к настоящему отчету.

Уровень исполнения расходов по региональным проектам по состоянию на 01.01.2020 составил 87,8 процента от планового объема, по состоянию на 01.01.2021 – 85,3 процента от планового объема ассигнований (ниже среднего уровня исполнения расходов по бюджету Республики Карелия на 01.01.2021 – 91,95 процента).

В полном объеме (100,0 процента от уточненного плана) в 2019-2020 годах исполнены расходы на реализацию мероприятий региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение», «Цифровая экономика Российской Федерации», практически в полном объеме – национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Данные об уровне исполнения плановых объемов в рамках национальных проектов за 2019 – 2020 годы представлены на рисунке 2.

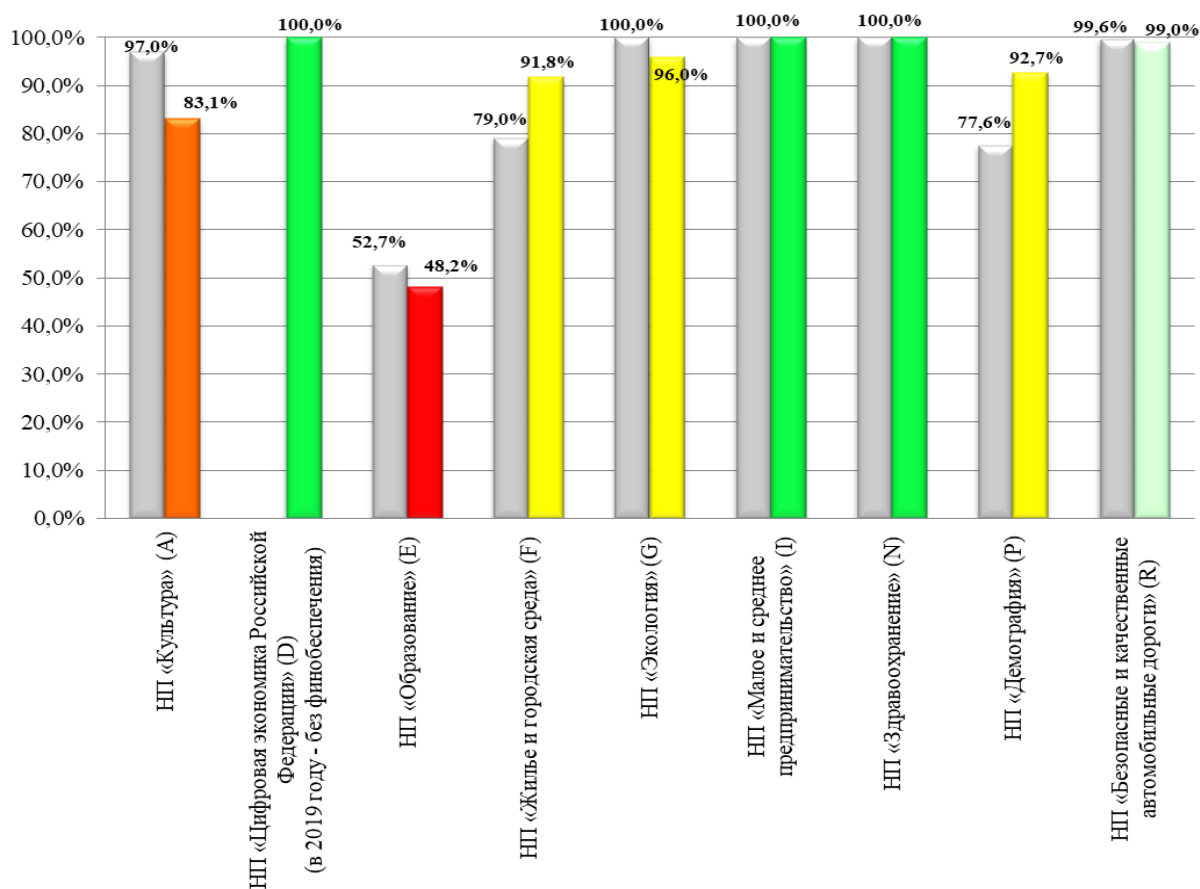Рисунок 2
(процентов)

По итогам реализации региональных проектов в 2020 году объем неосвоенных ассигнований по состоянию на 01.01.2021 составил 1 716 132,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 1 256 458,7 тыс. рублей, средств бюджета Республики Карелия – 459 673,8 тыс. рублей (по итогам 2019 года – 990 079,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 902 884,8 тыс. рублей).

В 2020 году значительное недовыполнение сложилось по национальному проекту «Образование» – исполнено 48,2 процента от планового объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 47,7 процента, за счет средств бюджета Республики Карелия – 49,5 процента (в 2019 году по указанному проекту также наблюдался низкий процент освоения бюджетных средств: исполнено 52,7 процента от планового объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,6 процента, за счет средств бюджета Республики Карелия – 65,9 процента).

Недовыполнение в целом по национальному проекту в 2019-2020 годах обусловлено низким освоением средств в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (42,0 процента в 2020 году и 47,2 процента в 2019 году) в части мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и модернизации инфраструктуры общего образования (главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия).

Остаток неосвоенных ассигнований в 2020 году по национальному проекту – 1 374 953,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –

988 966,6 тыс. рублей (в том числе по указанному федеральному проекту – 1 364 827,2 тыс. рублей, из них остатки ассигнований федерального бюджета в сумме 979 931,8 тыс. рублей) (в 2019 году – как в целом по национальному проекту, так и по указанному федеральному проекту – 369 193,5 тыс. рублей).

В рамках мероприятий по созданию 2 550 новых мест в общеобразовательных организациях планируется строительство зданий общеобразовательных организаций в г.Петрозаводск (микрорайон «Древлянка-б» жилого района «Древлянка-II») мощностью 1 350 мест и в г.Кемь мощностью 1 200 мест. Кассовые расходы на указанные цели при плане на 2020 год в сумме 2 090 776,2 тыс. рублей произведены в объеме 837 689,45 тыс. рублей (с остатком ассигнований 1 253 086,75 тыс. рублей).

По объекту «Строительство здания общеобразовательной организации в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка-б» жилого района «Древлянка-II», мощностью 1 350 мест» между КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» и АО «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» заключен государственный контракт от 26.12.2019 № 3зп-19 (реестровый номер контракта: 2100104131519000064), сумма контракта составила 1 192 302,919 тыс. рублей¹ (в том числе на 2020 год – 867 261,951 тыс. рублей), срок действия контракта продлен до 01.09.2021 (учтено, что все работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены Подрядчиком надлежащим образом не позднее 01.07.2021, срок ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 01.08.2021).

По государственному контракту от 30.06.2020 № 1С-20, заключенному между КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» и ООО «СтройГрупп» по объекту «Строительство здания общеобразовательной организации в г.Кемь мощностью 1 200 мест» (реестровый номер 2100104131520000044) на сумму 1 200 933,604 тыс. рублей (в том числе на 2020 год - 1 056 906,155 тыс. рублей), расходы по состоянию на 01.01.2021 составили 133 141,993 тыс. рублей. Срок действия контракта установлен до 31.12.2021, срок выполнения строительно-монтажных работ – не позднее 01.12.2021.

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта за 2020 год срок реализации мероприятий по созданию 2 550 новых мест в общеобразовательных организациях перенесен на 31.12.2021 года (в соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Карелия № 073-2019-Е1009-1/3.1 от 29.12.2020 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Карелия).

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» за 2020 год расходы на выполнение мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования при плановом объеме в сумме 213 006,9 тыс. рублей составили 106 752,66 тыс. рублей (с остатком ассигнований - 106 254,24 тыс. рублей) - произведена оплата аванса по государственному контракту от 14.12.2020 № 6С-20, заключенному между КУ РК «Управление

¹ Сумма контракта была увеличена после принятия распоряжения Правительства Республики Карелия от 16.10.2020 № 746р-П, согласно которому в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения, связанных с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, допускается по соглашению сторон изменение цены контракта от 26.12.2019 № 3зп-19.

капитального строительства Республики Карелия» и ООО «Ремонтно-строительная компания «АГАТ» на выполнение работ по объекту «Строительство здания общеобразовательной организации в пос. Деревянка Прионежского муниципального района на 200 мест». В соответствии с контрактом, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) (реестровый номер 2100104131520000096), общая сумма контракта составляет 397 145,313 тыс. рублей (в том числе на 2020 год - 106 752,66 тыс. рублей), завершение работ предусмотрено не позднее 31.12.2021.

Недовыполнение по национальному проекту «Культура» (процент исполнения по итогам 2020 года – 83,1 процента от плана) связано с низким исполнением расходов по федеральному проекту «Культурная среда» (неисполнение в части расходов по главному распорядителю бюджетных средств – Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия составило 13 823,8 тыс. рублей).

В рамках федерального проекта «Культурная среда» предусматривалась реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры, в том числе строительство сельского дома культуры в дер. Мегрега Олонецкого национального района (бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 38 809,8 тыс. рублей, кассовые расходы - 24 985,97 тыс. рублей, или 64,4 процента).

Согласно размещенному в ЕИС государственному контракту от 30.04.2020 № 20аэф-20 (реестровый номер 2100104131520000028), заключенному КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» с ООО «АвангардСтройКомплекс» на выполнение работ по объекту: Строительство сельского дома культуры в дер. Мегрега Олонецкого национального района в 2020-2021 годах (сумма контракта 58 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2020 год – 47 381,234 тыс. рублей), все работы, предусмотренные контрактом, должны были быть выполнены не позднее 30.06.2021. В связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта по причине нарушения подрядчиком сроков, установленных в графике производства работ, более чем на четырнадцать дней государственный контракт № 20аэф-20 от 30.04.2020 в декабре 2020 года расторгнут (уведомление об одностороннем отказе №2556/УКСи от 04.12.2020).

Контрольно-счетная палата отмечает, что отчет о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» за 2020 год не содержит информации о расторжении контракта, а также о возможных рисках исполнения мероприятия (при этом, в сведениях о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий раздела 5 отчета по контрольной точке «Заключение государственного контракта ...» отражено выполнение, с комментарием «отклонение в значении контрольной точки мероприятия отсутствует»).

Исполнение расходов на реализацию отдельных мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» (главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия) составило 91,8 процента от плана (в 2019 году - 79,0 процента). В рамках данного национального проекта недовыполнение от объема утвержденных ассигнований значится по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 90,2 процента (предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда).

Остаток неосвоенных ассигнований в 2020 году в целом по национальному проекту и по указанному федеральному проекту – 119 686,0 тыс. рублей (из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 117 476,7 тыс. рублей) (по итогам исполнения расходов за 2019 год остаток неосвоенных ассигнований составлял 63 054,4 тыс. рублей.).

Контрольно-счетная палата отмечает, что в соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта за 2020 год установленные значения показателей проекта «расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м ...» и «количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек...» перевыполнены по итогам отчетного года более чем в два раза. Согласно пояснений Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия остаток средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обусловлен предоставлением Республике Карелия дополнительной финансовой поддержки за счет средств Фонда в сумме 120 000,0 тыс. рублей в соответствии с решением Правления Фонда от 24.11.2020 (протокол № 1026); использование средств будет осуществляться в 2021 году.

По региональному проекту «*Формирование комфортной городской среды*» расходы произведены в полном объеме (исполнение по проекту составило 100,0 процента), в том числе в полном объеме освоены ассигнования, предусмотренные:

в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды;

ассигнования, предусмотренные в целях реализации на территории Сортавальского муниципального района мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в общем объеме 54 000,0 тыс. рублей (ассигнования выделены бюджету Сортавальского муниципального района в 2019 году с целью реализации указанных мероприятий, в 2019-2020 годах). Согласно показателям сводной бюджетной росписи на 01.01.2021 средства в сумме 13 872,1 тыс. рублей перечислены в 2020 году в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Сортавальского муниципального района, в сумме 40 127,9 тыс. рублей – БУ РК «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия»).

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта за 2020 год по состоянию на 01.01.2021 отмечено наличие риска недостижения результатов регионального проекта в части исполнения мероприятий по реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в связи с нарушением подрядчиком срока исполнения работ (в связи с нарушением подрядчиком срока исполнения работ муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству и перспективному развитию территории «Сквер у набережной по ул. Ленина в городе Сортавала» от 25.12.2019 № 48-19, заключенный между администрацией Сортавальского городского поселения и ООО «Стройтрест № 4», расторгнут 27.11.2020 с частичным исполнением). Дальнейшая реализация запланированных в рамках проекта мероприятий будет осуществляться вышеуказанным бюджетным учреждением. В соответствии с протоколом Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в

субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», проведенного Минстроем России 19.01.2021, сроки завершения мероприятий по проекту в г.Сортавала продлены до 01.09.2021 (пункт 8 Протокола от 19.01.2021 № 57-ПРМ-МЕ).

Процент исполнения по национальному проекту «Демография» по итогам 2020 года составил 92,7 процента от плана. Остаток неосвоенных ассигнований на 01.01.2021 в целом по национальному проекту составляет 166 839,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 136 709,2 тыс. рублей), из них по федеральному проекту «*Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет*» – 127 737,3 тыс. рублей, по федеральному проекту «*Спорт – норма жизни*» – 28 888,6 тыс. рублей (в 2019 году исполнение по национальному проекту составило 77,6 процента от плана, остаток неосвоенных ассигнований в целом по проекту - 488 436,4 тыс. рублей, из них по федеральному проекту «*Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет*» – 427 793,0 тыс. рублей, федеральному проекту «*Спорт – норма жизни*» - 40 349,4 тыс. рублей).

Недовыполнение обусловлено следующими причинами:

по федеральному проекту «*Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет*» (исполнение 85,5 процента; главный распорядитель бюджетных средств – Министерство образования Республики Карелия):

- расходы в рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (предоставление субсидий бюджетам Петрозаводского городского округа, Прионежского, Пряжинского и Сортавальского муниципальных районов) исполнены на 86,1 процента от плановых назначений (с остатком в объеме 119 100,8 тыс. рублей). Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2020 год не реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию зданий детских садов на 300 мест в г.Петрозаводске по адресу ул. Хейкконена (ввиду отсутствия участников признаны несостоявшимися электронные аукционы, объявленные в конце 2019 года, в июле 2020 года; в IV квартале начато проведение работ по строительству детского сада в рамках муниципального контракта от 21.09.2020) и на 150 мест в г.Сортавала по адресу пер.Первомайский (в 2020 году актуализирована сметная стоимость строительства объекта, заключен муниципальный контракт от 19.10.2020), сроки завершения строительства по указанным объектам перенесены на 2021 год

(в 2019 году недовыполнение мероприятий по указанному направлению установлено по Петрозаводскому городскому округу, Пряжинскому и Сортавальскому муниципальным районам);

- бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, предусматривались в форме субсидий в сумме 8 636,5 тыс. рублей для предоставления бюджету Петрозаводского городского округа. Бюджетные

ассигнования не освоены, соглашение с Петрозаводским городским округом расторгнуто в декабре 2020 года. Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2020 год частные предприниматели, имеющие лицензию на образовательную деятельность, отказались от участия в мероприятии;

по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» (исполнение в 2019 году – 77,6 процента, в 2020 году - 88,5 процента) - Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия не реализованы мероприятия федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в части строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске: при плане на 2020 год в объеме 44 870,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 15 988,7 тыс. рублей, или 35,6 процента, с остатком неосвоенных на 01.01.2021 ассигнований в сумме 28 881,9 тыс. рублей (объем неосвоенных ассигнований по вышеуказанному объекту строительства на 01.01.2020 года составлял 37 649,3 тыс. рублей).

В соответствии с информацией, размещенной в ЕИС, государственный контракт № 1зп-19 от 15.07.2019 на выполнение работ по строительству данного объекта, заключенный с ООО «АЛВАНИ СПБ», расторгнут в соответствии с соглашением о расторжении от 28.12.2020 (реестровый номер контракта: 2100104131519000023). В отчете о ходе реализации регионального проекта за 2020 год строительная готовность объекта оценивается на уровне 65 процентов, указано на необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, с предложением переноса срока завершения мероприятия (ввода объекта в эксплуатацию) - до 15.07.2021.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в сумме 72 434,5 тыс. рублей, исполнение составило 63 589,0 тыс. рублей (или 87,8 процента), остаток неосвоенных ассигнований – 8 845,5 тыс. рублей (за счет средств бюджета Республики Карелия).


Согласно информации, размещенной в ЕИС, муниципальный контракт № 41-19 от 04.12.2019 на строительство водопроводной очистной станции производительностью 8500 м³/сут. (по адресу: г. Сортавала, пер. Фабричный) был заключен между Администрацией муниципального образования «Сортавальское городское поселение» и АО «Промэнерго» (реестровый номер контракта: 3100701459719000052). В соответствии с дополнительным соглашением № 7 от 05.08.2020 к муниципальному контракту дальнейшая реализация мероприятия осуществляется КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия». В отчете о ходе реализации регионального проекта за 2020 год указано на наличие риска исполнения мероприятия (в ходе выполнения работ на объекте подрядной организацией выявлено несоответствие грунтов, заявленным проектной документацией, а также отсутствие работ по технологическому присоединению к электрическим сетям). Минстроем России согласован перенос срока реализации мероприятия на 2021 год.

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 01.01.2021 составил 31 965,6 тыс. рублей, из них по федеральному проекту «Дорожная сеть» - 8 473,9 тыс. рублей (при этом, по отношению к плановому объему на 2020 год исполнение составляет 99,7 процента), по федеральному проекту «Общесистемные

меры развития дорожного хозяйства» - 23 491,7 тыс. рублей, или 91,1 процента к плану (согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2020 год остаток образовался в связи с экономией по результатам проведения мероприятий по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, мероприятий по увеличению количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения).

Изменение структуры кассовых расходов в разрезе национальных проектов в 2019 – 2020 годах приведено на рисунке 3.

Рисунок 3

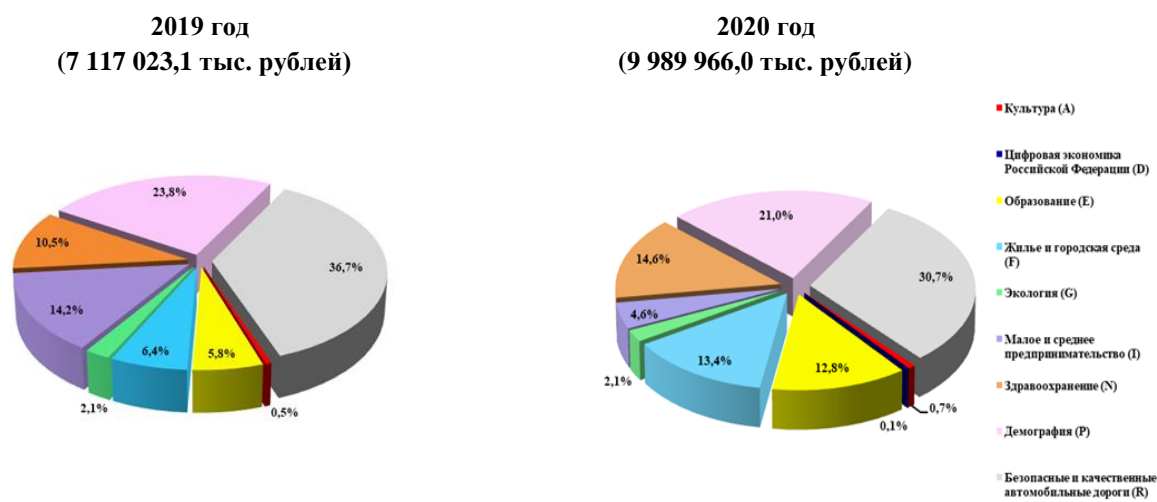

В 2020 году по сравнению с 2019 годом:

уменьшилась доля кассовых расходов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в общем объеме бюджетных расходов (с 14,2 процента до 4,6 процента от общего объема расходов), на 6,0 процентных пункта уменьшилась доля расходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

увеличилась доля кассовых расходов на 7,0 процентных пункта на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» и «Жилье и городская среда» (расходы возросли на 868 715,4 тыс. рублей и 883 534,5 тыс. рублей соответственно), на 4,1 процентных пункта увеличилась доля расходов в рамках национального проекта «Здравоохранение» (кассовые расходы по проекту увеличились на 708 807,1 тыс. рублей).

На реализацию региональных составляющих федеральных (национальных) проектов бюджетные ассигнования в 2020 году предусмотрены по 11 главным распорядителям, в 2019 году – по 10 главным распорядителям (по Администрации Главы Республики Карелия в рамках реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019 году расходы не осуществлялись).

В соответствии с Законом о бюджете на 2020 год наибольший объем бюджетных ассигнований в 2020 году предусмотрен по Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики

Карелия (3 833 564,4 тыс. рублей, или 33,4 процента от общего объема ассигнований на реализацию национальных проектов), Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (3 042 717,50 тыс. рублей, или 26,5 процента), Министерству здравоохранения Республики Карелия (1 458 181,7 тыс. рублей или 12,7 процента).

За 2020 год по семи главным распорядителям бюджетных средств (Министерству здравоохранения Республики Карелия, Министерству культуры Республики Карелия, Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерству спорта Республики Карелия, Администрации Главы Республики Карелия и Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия) годовые бюджетные назначения, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 01.01.2021, исполнены на 100,0 процента, по Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия – на 99,0 процента, по Министерству социальной защиты Республики Карелия – 99,1 процента, по Министерству образования Республики Карелия – 88,3 процента.


Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований образовался у Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия – 1 530 578,2 тыс. рублей (89,2 процента от общего объема неисполненных расходов бюджета) – план исполнен на 60,9 процента.


Анализ расходов бюджета Республики Карелия на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов в разрезе главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия за 2019-2020 годы приведен в приложениях 12 и 13 к настоящему отчету.

Контрольно-счетная палата отмечает сохранение тенденции неравномерного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федеральных (национальных) проектов: основное расходование бюджетных средств произведено в IV кварталах 2019 и 2020 годов (47,8 процента и 44,2 процента от общего объема произведенных расходов за год соответственно).

Динамика освоения средств на указанные цели приведена на рисунке 4.

Рисунок 4
(млн рублей)

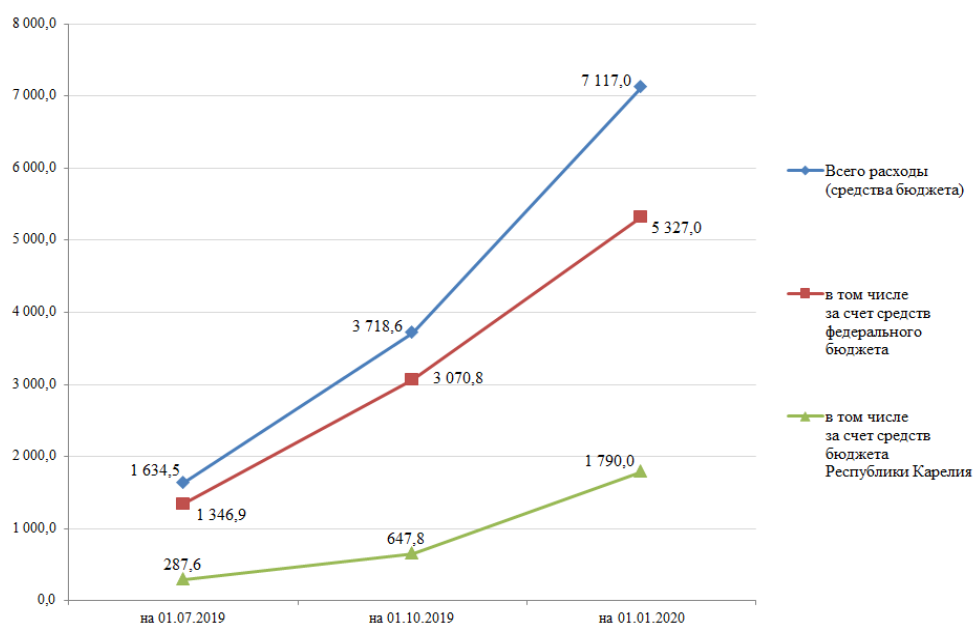

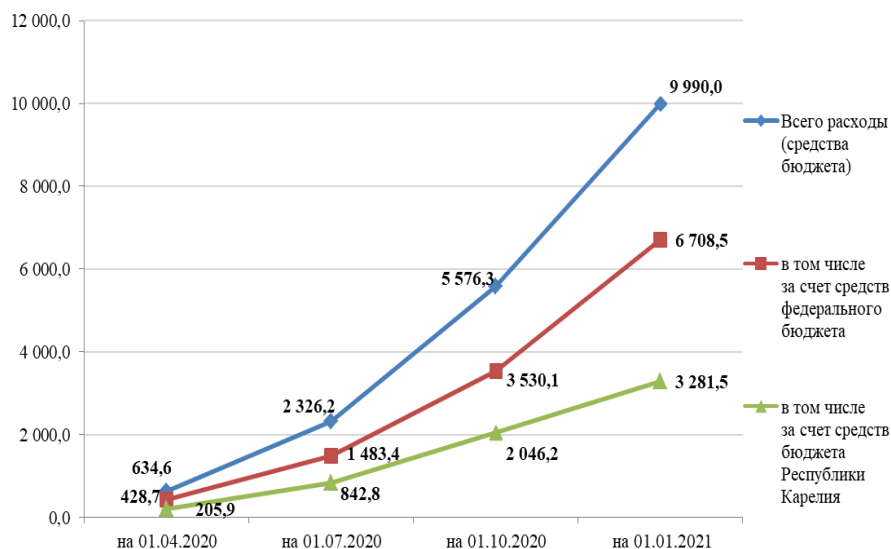

При общем освоении бюджетных плановых назначений за 2020 год – 85,3 процента от планового объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью на 01.01.2021 (за 2019 год – 87,8 процента), освоение за 1 квартал 2020 года составило только 6,5 процента от годовых плановых назначений (по состоянию на 01.04.2020), за II квартал 2020 года – 13,8 процента (или нарастающим за 6 месяцев – 20,3 процента), за III квартал 2020 года – 27,4 процента (или нарастающим за 9 месяцев – 47,7 процента), за IV квартал – 37,6 процента от уточненного годового плана. Удельный вес в общих кассовых расходах (9 989,97 млн рублей) за I квартал 2020 года составил 6,4 процента, за II квартал – 16,9 процента, за III квартал – 32,5 процента, за IV квартал 2020 года – 44,2 процента (за первое полугодие 2019 года проведено 23,0 процента от годовых расходов, за III квартал – 29,2 процента, за IV квартал 2019 года – 47,8 процента).

Низкое освоение бюджетных ассигнований в течение I полугодия, 9 месяцев могло привести к рискам невыполнения мероприятий или недостижения отдельных показателей, неосвоения бюджетных средств в целом по итогам года.

Законом о бюджете на 2020 год ассигнования на реализацию 9 национальных проектов предусмотрены структурными элементами (основными мероприятиями) в рамках 13 государственных программ Республики Карелия (Законом о бюджете на 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию 8 национальных проектов распределены в рамках 12 государственных программ Республики Карелия). Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Код	Наименование национальных проектов	Наименование государственных программ	
		2019 год	2020 год
A	НП «Культура»	ГП Развитие культуры	ГП Развитие культуры
D	НП «Цифровая экономика Российской Федерации»		ГП Информационное общество
E	НП «Образование»	ГП Развитие образования ГП Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики	ГП Развитие образования

Код	Наименование национальных проектов	Наименование государственных программ	
		2019 год	2020 год
F	НП «Жилье и городская среда»	ГП Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами	ГП Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
		ГП Формирование современной городской среды	ГП Формирование современной городской среды
G	НП «Экология»	ГП Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами	ГП Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
		ГП Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды	ГП Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
I	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	ГП Экономическое развитие и инновационная экономика	ГП Экономическое развитие и инновационная экономика
		ГП Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов	ГП Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
N	НП «Здравоохранение»	ГП Развитие здравоохранения	ГП Развитие здравоохранения
		ГП Развитие образования	ГП Развитие образования
P	НП «Демография»	ГП Развитие здравоохранения	ГП Развитие здравоохранения
		ГП Развитие образования	ГП Развитие образования
		ГП Совершенствование социальной защиты граждан	ГП Совершенствование социальной защиты граждан
		ГП Содействие занятости населения	ГП Содействие занятости населения
		ГП Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики	ГП Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики
R	НП «Безопасные и качественные дороги»	ГП Развитие транспортной системы	ГП Развитие транспортной системы
		ГП Развитие здравоохранения	

В общих расходах на реализацию мероприятий национальных проектов за счет средств бюджета Республики Карелия на 01.01.2021 наибольший объем расходов сложился по государственным программам: «Развитие транспортной системы» – 30,7 процента (3 066 651,9 тыс. рублей, или 99,0 процента от плана в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2021), «Развитие образования» – 21,1 процента (2 106 394,3 тыс. рублей, или 58,4 процента от плана), «Развитие здравоохранения» – 13,8 процента (1 378 712,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процента), «Совершенствование социальной защиты граждан» – 11,2 процента (1 120 855,0 тыс. рублей, исполнение – 99,1 процента).

Информация о расходах бюджета Республики Карелия на реализацию национальных проектов в рамках государственных программ Республики Карелия за 2019 год, 2020 год представлена в приложениях 14, 15 к настоящему отчету.

Данные о расходах в разрезе видов расходов представлены в таблице 5.

Таблица 5
(млн рублей)

код	вид расходов наименование	Исполнено за 2019 год	Исполнено по состоянию на 01.10.2020	Плановый объем		Исполнено 2020 год	% исп. за 2020 год к показателям сводн. бюдж. росписи бюджета РК	Уд. вес расходов (исполнено)
				на 2020 год				
				Закон о бюджете на 2020 год	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021			
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0,412	0,0	0,01	4,81	4,76	98,84	0,05

вид расходов		Исполнено за 2019 год	Исполнено по состоянию на 01.10.2020	Плановый объем		Исполнено 2020 год	% исп. за 2020 год к показателям сводн. бюдж. росписи бюджета РК	Уд. вес расходов (исполнено)
				на 2020 год				
код	наименование			Закон о бюджете на 2020 год	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021			
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 160,05	1 541,52	2 879,85	2 935,75	2 907,56	99,04	29,10
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	724,72	732,12	1 033,71	1 050,06	1 044,28	99,45	10,45
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	32,848	51,27	57,89	57,89	57,89	100,00	0,58
340	Стипендии	0,703	1,25	1,62	1,62	1,62	100,00	0,02
410	Бюджетные инвестиции	346,80	188,82	2 497,20	2 493,84	1 082,95	43,42	10,84
460	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	58,496	21,16	69,22	30,37	30,36	100,00	0,30
520	Субсидии	772,77	914,36	2 348,54	2 469,74	2 221,73	89,96	22,24
540	Иные межбюджетные трансферты	1091,849	330,04	655,55	615,42	611,22	99,32	6,12
610	Субсидии бюджетным учреждениям	551,831	793,15	913,86	958,86	954,10	99,50	9,55
620	Субсидии автономным учреждениям	304,713	466,65	480,15	471,67	458,28	97,16	4,59
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	365,219	329,35	368,11	372,61	372,61	100,00	3,73
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	706,618	206,62	182,54	243,46	242,61	99,65	2,43
ВСЕГО		7 117,02	5 576,31	11 488,25	11 706,10	9 989,97	85,34	100,00

Крайне низкое исполнение по отношению к плановому объему на 2020 год сложилось по КВР 410 «Бюджетные инвестиции» – 43,4 процента (за счет низкого исполнения расходов в рамках реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Экология»), при этом по состоянию на 01.10.2020 исполнение составило всего 7,4 процента; доля расходов по КВР 410 составляет 10,8 процента от общего объема освоенных в рамках проектов средств. За 2019 год исполнение по данному виду расходов составило 45,9 процента (в том числе за счет низкого исполнения расходов в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»).

Освоение бюджетных средств по КВР 520 «Субсидии» составило 90,0 процента (за счет недоосвоения расходов в рамках реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Демография» и «Жилье и городская среда»), при этом по состоянию на 01.10.2020 исполнение составляло 33,6 процента (по итогам за 2019 год исполнение по указанному виду расходов - 61,0 процента).

Расходы по КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» за 2020 год исполнены на 98,8 процента (по состоянию на 01.10.2020 кассовые расходы по данному виду расходов не осуществлялись). Доля указанных расходов в общем объеме освоенных средств незначительна и составляет 0,05 процента.

Расходы по КВР 620 «Субсидии автономным учреждениям» за 2020 год исполнены на 97,2 процента, за 2019 год – 100,0 процента.

В 2020 году на уровне 99,0 – 99,6 процента расходы исполнены по следующим КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам», 540 «Иные межбюджетные трансферты», 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

На уровне 100,0 процента исполнены расходы по КВР 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат», 340 «Стипендии», 460 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» (при этом по состоянию на 01.10.2020 кассовые расходы по данному виду расходов составили 28,4 процента за счет низкого исполнения расходов в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»), 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

Информация о расходах бюджета Республики Карелия на реализацию национальных проектов по видам расходов за 2019 год, 2020 год представлена в приложениях 16, 17 к настоящему отчету.

Наибольший объем расходов в разрезе групп видов расходов за 2020 год осуществлен по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 29,1 процента от общего объема кассовых расходов за счет средств бюджета Республики Карелия в рамках национальных проектов (при удельном весе данных расходов в плановом объеме – 25,1 процента), исполнение плана - 99,04 процента от показателей сводной бюджетной росписи на 01.01.2021 (за 2019 год доля расходов по данному виду расходов составила 30,4 процента от общего объема кассовых расходов в рамках проектов).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализированы отдельные формы бюджетной, бухгалтерской отчетности, предусмотренной в целях раскрытия информации о ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов): формы 0503128-НП, 0503117-НП, 0503738-НП.

По данным сводного отчета по ф.0503128-НП, представленного в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия¹, по состоянию на 01.01.2020 всего принято бюджетных обязательств на общую сумму 7 703 343,27 тыс. рублей (из них с применением конкурентных процедур – 2 543 664,1 тыс. рублей), не исполнены бюджетные обязательства –

¹ Сводный отчет о бюджетных обязательствах формируется в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191-н), и представляется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета субъекта РФ начиная с отчетности на 01.10.2019.

586 320,14 тыс. рублей или 7,6 процента от принятых бюджетных обязательств, не исполнены денежные обязательства – 3,0 тыс. рублей.

По данным сводного отчета по ф.0503128-НП, представленного в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия, по состоянию на 01.01.2021 всего принято бюджетных обязательств на общую сумму 11 515 013,03 тыс. рублей (из них с применением конкурентных процедур – 5 005 216,83 тыс. рублей), не исполнены бюджетные обязательства в объеме 1 525 047,5 тыс. рублей или 13,2 процента от принятых бюджетных обязательств; денежные обязательства не исполнены в объеме 2 091,83 тыс. рублей или 0,02 процента от объема принятых денежных обязательств.

Основной объем неисполненных бюджетных обязательств отражен по Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия – в сумме 1 399 540,5 тыс. рублей (или 91,8 процента от общего объема неисполненных БО), из них 1 244 894,9 тыс. рублей по КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

По Министерству образования Республики Карелия остаток неисполненных БО составил 119 619,0 тыс. рублей (в том числе по федеральному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - 119 100,8 тыс. рублей).

В 2020 году неисполненные бюджетные обязательства по КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности», 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности», 523 «Консолидированные субсидии», 540 «Иные межбюджетные трансферты» составили 242 839,12 тыс. рублей или 15,9 процента от общего объема неисполненных бюджетных обязательств (в том числе за счет низкого исполнения расходов в рамках реализации национальных проектов «Демография», «Жилье и городская среда»).

Согласно представленным главными распорядителями бюджетных средств отчетов по ф.0503128-НП¹, по КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в рамках реализации мероприятий региональных составляющих национальных проектов «Экология», «Здравоохранение», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» всего принято бюджетных обязательств на общую сумму 2 935 751,2 тыс. рублей (из них с применением конкурентных процедур – 2 619 617,76 тыс. рублей), не исполнены бюджетные обязательства – 1 256,23 тыс. рублей, не исполнены денежные обязательства – 2,01 тыс. рублей (по Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

¹ Отчет о бюджетных обязательствах формируется в соответствии с Инструкцией № 191н главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, начиная с отчетности на 01.10.2019.

Информация о принятых бюджетных обязательствах в 2020 году на осуществление закупок представлена в таблице 6.

Таблица 6
(тыс. рублей)

Наименование национального проекта	Исполнено за 2019 год	Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год	Принятые бюджетные обязательства на 2020 год	Принятые денежные обязательства на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Не исполнено за 2020 год		% исполнения принятых бюджетных обязательств
						принятых бюджетных обязательств	Принятых денежных обязательств	
НП «Экология»	12 020,9	2 542,6	2 542,6	2 542,6	2 542,6	0,0	0,0	100,0
НП «Здравоохранение»	78 302,0	427 105,3	427 105,3	427 105,3	427 105,3	0,0	0,0	100,0
НП «Демография»	97,0	30,8	30,8	30,0	30,0	0,8	0,0	97,5
НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	2 069 626,4	2 506 072,5	2 479 135,0	2 477 881,6	2 477 879,5	1 255,5	2,0	99,9
Всего	2 160 046,3	2 935 751,2	2 908 813,7	2 907 559,5	2 907 557,5	1 256,2	2,0	100,0

Информация о принятых бюджетных обязательствах на реализацию национальных проектов за 2019 год, 2020 год представлена в приложениях 18 и 19 к настоящему отчету.

В 2020 году плановый объем бюджетных ассигнований на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд по сравнению с 2019 годом увеличился 766 016,24 тыс. рублей, объем принятых бюджетных обязательств – на 748 693,82 тыс. рублей, объем исполненных обязательств – на 747 511,2 тыс. рублей (или на 34,6 процента).

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе в рамках реализации национальных проектов, осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Информация о закупках, осуществляемых в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, в том числе в рамках национальных проектов, размещается в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС).

В рамках реализации мероприятий региональных составляющих национальных проектов на территории Республики Карелия предусмотрены бюджетные ассигнования бюджетным и автономным учреждениям Республики Карелия, подведомственным органам исполнительной власти Республики Карелия, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – субсидии на выполнение государственного задания), на иные цели и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность.

Общий объем предоставленных в 2019-2020 годах субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетным и автономным учреждениям в рамках реализации национальных проектов представлен в таблице 7.

Таблица 7
(тыс. рублей)

	2019 год		2020 год				
	Принятые бюджетные обязательства; исполнено	Утверждено БА	Принятые бюджетные обязательства	Принятые денежные обязательства	Исполнено	Не исполнено	
						Принятых БО	Принятых ДО
Бюджетные учреждения							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	92 478,24	171 151,30	167 624,97	167 624,97	167 624,97	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	459 352,49	787 713,06	786 492,81	786 474,62	786 474,62	18,19	0,00
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	58 495,64	30 365,00	30 364,81	30 364,81	30 364,81	0,00	0,00
Автономные учреждения							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	107 744,40	115 725,00	115 725,00	115 725,00	115 725,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	196 968,40	355 943,00	342 551,33	342 551,33	342 551,33	0,00	0,00
Итого	915 039,17	1 460 897,36	1 442 758,92	1 442 740,73	1 442 740,73	18,19	0,00

В 2020 году по сравнению с 2019 годом плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям увеличился на 545 857,9 тыс. рублей, объем принятых бюджетных обязательств - на 527 719,8 тыс. рублей, объем исполненных обязательств – на 527 701,6 тыс. рублей (или на 57,7процента).

Кассовое исполнение расходов бюджета Республики Карелия за 2020 год на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий составило 1 442 740,7 тыс. рублей, или 98,8 процента от плановых бюджетных ассигнований (остаток неосвоенных ассигнований составил 18 156,6 тыс. рублей) и 100,0 процента от принятых бюджетных обязательств.

Удельный вес расходов за счет предоставленных субсидий в общих объемах бюджетных расходов на национальные проекты в 2019 и 2020 годах составил 12,9 процента и 14,4 процента соответственно.

Информация об объемах субсидий, предоставленных из бюджета Республики Карелия бюджетным и автономным учреждениям в рамках реализации национальных проектов, за 2019 год, 2020 год представлена в приложениях 20 и 21 к настоящему отчету.

Согласно представленным главными распорядителями бюджетных средств Отчетам по ф.0503738-НП¹ бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия, подведомственными органам исполнительной власти Республики Карелия, в 2020 году в рамках реализации мероприятий региональных

¹ Отчет о бюджетных обязательствах формируется государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, , начиная с отчетности на 01.01.2020.

Формирование отчета по ф.0503738-НП по коду вида финансового обеспечения (деятельности) – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания не предусмотрено, составляется отдельно по видам финансового обеспечения (деятельности): субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

проектов по видам финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений с учетом неиспользованных остатков по состоянию на 01.01.2020 принято обязательств на сумму 1 149 387,95 тыс. рублей, исполнено – 1 115 690,57 тыс. рублей.

Информация о принятых бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в 2020 году обязательствах (в части использования субсидий на иные цели и субсидий на цели осуществления капитальных вложений) представлена в таблице 8.

Таблица 8
(тыс. рублей)

Наименование национального проекта	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено	Не исполнено	
		принятые обязательства		денежные обязательства		принятых БО	принятых ДО
		всего	из них с применением конкурентных способов				
Министерство культуры РК							
Национальный проект «Культура»	32 964,75	32 964,75	32 964,75	32 964,75	32 964,75	0,00	0,00
Администрация Главы РК							
Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	6 525,66	6 525,66	6 525,66	6 525,66	6 525,66	0,00	0,00
Министерство здравоохранения РК							
всего, в том числе:	756 272,60	734 518,10	632 313,29	703 900,05	702 905,72	31 612,38	994,33
Национальный проект «Здравоохранение»	754 873,94	733 183,37	631 147,81	702 588,18	701 593,85	31 589,52	994,33
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	1 162,66	1 110,57	941,33	1 087,71	1 087,71	22,86	0,00
Национальный проект «Демография»	236,00	224,16	224,16	224,16	224,16	0,00	0,00
Министерство образования РК							
Национальный проект «Образование»	316 726,89	315 804,15	282 584,84	313 719,14	313 719,14	2 085,01	0,00
Министерство природных ресурсов и экологии РК							
Национальный проект «Экология»	47 989,40	47 989,40	47 989,40	47 989,40	47 989,40	0,00	0,00
Министерство спорта РК							
Национальный проект «Демография»	11 585,90	11 585,90	0,00	11 585,90	11 585,90	0,00	0,00
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК							
Национальный проект «Жилье и городская среда»	40 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	1 212 193,09	1 149 387,95	1 002 377,94	1 116 684,90	1 115 690,57	33 697,39	994,33

Не исполнено принятых обязательств на общую сумму 33 697,4 тыс. рублей, в том числе:

31 612,38 тыс. рублей – учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Республики Карелия, из них 31 589,5 тыс. рублей - в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», в том числе 23 970,6 тыс. рублей – по федеральному (региональному) проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (в указанном объеме остаток

неисполненных обязательств по ГБУЗ РК «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» составил 17 330,42 тыс. рублей) (согласно распоряжению Министерства здравоохранения Республики Карелия от 11.01.2021 № 8-р (в ред. распоряжения от 10.03.2021 № 175-р) неиспользованные по состоянию на 01.01.2021 остатки средств, перечисленные бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий региональных проектов и числящиеся на счетах учреждений, согласованы к использованию в 2021 году в соответствии с их целевым назначением (в том числе на исполнение принятых бюджетных обязательств);

2 085,01 тыс. рублей – учреждениями, подведомственными Министерству образования Республики Карелия, при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Доля кассовых расходов бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия на закупку товаров, работ, услуг, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также в целях капитального ремонта государственного имущества, в 2020 году составила 94,4 процента от общей суммы произведенных расходов за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

Информация о расходах бюджетных и автономных учреждений на реализацию мероприятий региональных проектов, в части закупки товаров, работ, услуг, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также в целях капитального ремонта государственного имущества, за 2020 год (при использовании субсидий на иные цели и субсидий на цели осуществления капитальных вложений) представлена в приложении 22 к настоящему отчету.

В соответствии со статьей 15 Закона № 44-ФЗ бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

Автономными учреждениями планирование и осуществление закупок с учетом положений Закона № 44-ФЗ осуществляется при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности.

Закупки автономного учреждения, источником финансового обеспечения которых является субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания или субсидия на иные цели, регулируются положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Так, государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», Учреждение) в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ осуществлялись закупки в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В ЕИС 30.04.2020 размещена информация о закупке ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» с начальной (максимальной) ценой контракта – 228 176,5 тыс. рублей (номер закупки 32009129446).

По результатам открытого аукциона в электронной форме Учреждением заключен контракт № 1аэф-20/223-ФЗ от 15.06.2020, цена контракта составила 220 190,322 тыс. рублей.

Согласно документации приобретено оборудование (МФУ (принтер, сканер, копир) – 101 шт., ноутбуки для управленческого персонала – 609 шт., ноутбуки педагога – 224 шт., интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением – 207 шт., ноутбук мобильного класса – 3 360 шт.) для образовательных учреждений, расположенных во всех (18) муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия (всего для 101 образовательного учреждения). Оборудование передается учреждениям на ответственное хранение с правом пользования до передачи имущества в муниципальную собственность.

Таким образом, фактически ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» предоставлена субсидия на иные цели для осуществления закупки оборудования для муниципальных учреждений, т.е. на проведение централизованной закупки для нужд в сфере образования. При этом, поскольку закупка осуществлялась автономным учреждением, процедура проведена в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ.

В части указанной закупки отмечаем следующее:

1) Пунктом 4 статьи 79 Бюджетного кодекса органам государственной власти (государственным органам), являющимся государственными заказчиками, предоставлено право передать на основании соглашений свои полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению от имени публично-правового образования государственных контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей. При этом статьей 15 Закона № 44-ФЗ действие норм Закона № 44-ФЗ распространено на такие закупки, включая контроль в сфере закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.

Статьей 26 Закона № 44-ФЗ установлен порядок осуществления централизованных закупок, при этом предусмотрено возложение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на государственный орган, муниципальный орган или казенное учреждение. К таким закупкам также применяются положения Закона № 44-ФЗ, которые регламентируют права и обязанности заказчика, а также контроль в сфере закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок. Возложение указанных полномочий на автономное учреждение Законом № 44-ФЗ не предусматривается.

2) В соответствии с Соглашением от 20.04.2020 № 20-2020-01504, заключенным между Министерством образования Республики Карелия и ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», Учреждению предоставлена субсидия на иные цели для реализации мероприятий по внедрению

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» путем закупки оборудования для муниципальных образовательных учреждений.

По мнению Контрольно-счетной палаты цель вышеуказанной закупки не соответствует целям деятельности учреждения, установленным распоряжением Правительства Республики Карелия от 30.12.2011 № 818р-П по вопросу создания ГАОУ РК ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»¹ и указанным в Уставе ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», а именно: основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

3) Перечень оборудования, приобретаемого в целях реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда», предварительно согласован ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», являющимся проектным офисом национального проекта «Образование». Одновременно в письме-согласовании (от 04.03.2020 № 1000/0403-29) указано, что при проведении закупок необходимо руководствоваться актуальными нормами законодательства Российской Федерации, в том числе о применении национального режима при осуществлении закупок, установленным Законом № 44-ФЗ; об учете требований антимонопольного законодательства (и, в том числе, в части исключения ограничения круга поставщиков и поставляемого оборудования).

Следовательно, учитывая классификацию приобретаемых товаров (оборудования) требовалось соблюдение положений статьи 14 Закона № 44-ФЗ.

4) В ходе проведения процедуры закупки Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия рассматривалась жалоба о нарушении части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось в неправомерном объединении в объект закупки технологически не связанных товаров (многофункциональных устройств, ноутбуков, интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением). Решением Карельского УФАС России от 11.06.2020 по жалобе № 010/07/3-353/2020 жалоба признана необоснованной, в том числе в связи с тем, что Закон № 223-ФЗ не определяет правила формирования лота.

Учитывая изложенное, по мнению Контрольно-счетной палаты, проведение централизованных закупок (в частности, для системы образования) необходимо осуществлять в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

В целях реализации национальных проектов на территории Республики Карелия в анализируемом периоде предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований. В 2019 году межбюджетные трансферты предоставлены на реализацию мероприятий 9 региональных проектов в рамках 6 национальных проектов, в 2020 году – на реализацию мероприятий 8 региональных проектов в рамках 6 национальных проектов. В 2020 году по сравнению с 2019 годом не были

¹ Распоряжением Правительства Республики Карелия от 22.05.2013 № 281р-П ГАОУ РК ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» переименовано в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».

запланированы межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В соответствии с первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2020 год объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в целях реализации национальных проектов (далее – межбюджетные трансферты) на 2020 год составил 2 422 687,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 140 316,2 тыс. рублей (88,3 процента), за счет средств бюджета Республики Карелия – 282 371,1 тыс. рублей (11,7 процента). По состоянию на 01.10.2020 указанный показатель в соответствующей редакции Закона о бюджете на 2020 год (ред. от 29.06.2020) увеличился на 38,7 процента и составил 3 360 338,5 тыс. рублей. В окончательной редакции Закона о бюджете на 2020 год (ред. от 11.12.2020) объем межбюджетных трансфертов составил 3 004 085,5 тыс. рублей (на 24 процента выше первоначального объема) и превысил аналогичный показатель Закона о бюджете на 2019 год на 591 162,5 тыс. рублей, или на 24,5 процента.

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2021 уточненный объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов на 2020 год предусмотрен в размере 3 085 157,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 778 320,1 тыс. рублей (90,1 процента), за счет средств бюджета Республики Карелия – 306 837,5 тыс. рублей (9,9 процента)), что на 81 072,1 тыс. рублей, или на 2,7 процента, выше показателя Закона о бюджете на 2020 год. В сравнении с аналогичным показателем 2019 года уточненный плановый объем межбюджетных трансфертов на 2020 год выше на 672 234,6 тыс. рублей, или на 27,9 процента. Причем данное увеличение полностью связано с увеличением средств федерального бюджета на указанные цели (на 681 688,8 тыс. рублей, или на 32,5 процента); средства бюджета Республики Карелия снизились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 9 454,2 тыс. рублей (или на 3,0 процента). Относительно 2019 года в 2020 году по 4 региональным проектам плановый объем увеличился (наибольшее увеличение достигнуто по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»), по 5 региональным проектам плановый объем уменьшился (наибольшее снижение имело место по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»).

В течение 2020 года плановый объем межбюджетных трансфертов по сравнению с первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2020 год возрос на 662 470,3 тыс. рублей (на 27,3 процента), что в основном связано с увеличением федеральных средств на указанные цели (на 29,8 процента).

Наибольшие изменения в виде увеличения планового объема бюджетных ассигнований в течение 2020 года претерпели межбюджетные трансферты на реализацию региональных проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (увеличение составило 95,6 процента) и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (увеличение составило 35,1 процента). Источником увеличения являлись федеральные средства, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Снижение планового объема бюджетных ассигнований в течение 2020 года имело место по двум региональным проектам: «Чистая вода» (снижение составило 99,2 процента в основном за счет федеральных средств) и «Спорт – норма жизни» (снижение составило 1,8 процента за счет средств бюджета Республики Карелия).

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» плановый объем межбюджетных трансфертов остался на первоначальном уровне.

(В течение 2019 года плановый объем межбюджетных трансфертов по сравнению с первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2019 год возрос на 378 847,2 тыс. рублей (на 18,6 процента). Наибольшие изменения в части увеличения планового объема претерпели межбюджетные трансферты по региональному проекту «Спорт – норма жизни» (увеличение составило 50,0 процента), в части снижения планового объема – по региональному проекту «Культурная среда» (снижение составило 43,8 процента). На реализацию региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Чистая вода» плановый объем межбюджетных трансфертов на 2019 год остался на первоначальном уровне, а по региональному проекту «Дорожная сеть» - изменился незначительно (снижение менее 1 процента). Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 год в первоначальной редакции Закона о бюджете на 2019 год не были предусмотрены, уточненный плановый объем составил 320 268,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», предусмотренные в первоначальной редакции Закона о бюджете на 2019 год в размере 80 856,5 тыс. рублей, в течение 2019 года исключены из состава межбюджетных трансфертов).

Сравнительная характеристика уточненного планового объема межбюджетных трансфертов за анализируемый период представлена в таблице 9.

Таблица 9

Показатель	2019 год	2020 год		Отклонения уточненного показателя 2020 года от показателя 2019 года
		на 01.10.2020	на 01.01.2021	
1. Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в целях реализации национальных проектов (МБТ НП), тыс. рублей	2 412 923,0	3 360 338,5	3 085 157,6	672 234,6
2. Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	55 104 140,4	72 210 203,7	73 532 826,2	x
2.1. Доля МБТ НП в общем объеме бюджетных ассигнований, %	4,4	4,7	4,2	-0,2
3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, тыс. рублей	8 107 102,4	11 684 621,5	11 706 098,5	x
3.1. Доля МБТ НП в общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, %	29,8	28,8	26,4	-3,4
4. Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, тыс. рублей	13 795 338,3	18 274 713,5	17 196 537,7	x
4.1. Доля МБТ НП в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, %	17,5	18,4	17,9	0,4
5. Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований, тыс. рублей	13 778 672,3	18 177 822,6	17 109 429,0	x

Показатель	2019 год	2020 год		Отклонения уточненного показателя 2020 года от показателя 2019 года
		на 01.10.2020	на 01.01.2021	
5.1. Доля МБТ НП в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований, %	17,5	18,5	18,0	0,5
6. Субсидии в составе МБТ НП: тыс. рублей; %	1 266 314,9 52,5	2 719 128,2 80,9	2 469 735,2 80,1	1 203 420,3 27,6
7. Иные межбюджетные трансферты в составе МБТ НП: тыс. рублей; %	1 146 608,1 47,5	641 210,3 19,1	615 422,4 19,9	-531 185,7 -27,6

Согласно данным таблицы 9 в 2020 году доля планового объема межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов в общем объеме бюджетных ассигнований, в общем объеме межбюджетных трансфертов (в том числе бюджетам муниципальных образований) по сравнению с 2019 годом значительных изменений не претерпела, в то время как их доля в общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов снизилась на 3,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

В 2020 году структура межбюджетных трансфертов изменилась: выросла на 27,6 процентных пункта доля субсидий с одновременным увеличением их объема на 95,0 процента и, соответственно, снизилась доля иных межбюджетных трансфертов при уменьшении их объема на 46,3 процента.

Наибольший (68,1 процента) плановый объем межбюджетных трансфертов в 2020 году предусмотрен по региональным проектам «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (39,7 процента) и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (28,4 процента). В 2019 году основной (70,7 процента) плановый объем межбюджетных трансфертов также приходится на два региональных проекта: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (48,3 процента) и «Дорожная сеть» (22,4 процента).

Наименьший плановый объем предусмотрен в 2020 году по региональному проекту «Чистая вода» (0,03 процента), в 2019 году – по региональному проекту «Современная школа» (0,5 процента).

Подробный анализ планового объема межбюджетных трансфертов за 2019-2020 годы в разрезе национальных и региональных проектов представлен в приложениях 24 и 25 к настоящему отчету.

В анализируемом периоде межбюджетные трансферты были предусмотрены по пяти главным распорядителям средств бюджета Республики Карелия. Наибольший плановый объем предусмотрен в 2020 году Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (46,0 процента) на реализацию трех региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода»; в 2019 году – Министерству образования Республики Карелия (49,2 процента) на реализацию двух региональных проектов: «Успех каждого ребенка» и «Содействие

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Наименьший объем межбюджетных трансфертов в 2019-2020 годах был предусмотрен Министерству культуры Республики Карелия (0,3 процента), ответственному за реализацию регионального проекта «Культурная среда».

Подробный анализ планового объема межбюджетных трансфертов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2020 год представлен в приложении 27 к настоящему отчету.

В анализируемом периоде предоставление межбюджетных трансфертов запланировано в рамках 6 государственных программ Республики Карелия (приложение 28 к настоящему отчету). Наибольший объем предусмотрен в 2020 году по государственной программе Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (39,8 процента), в 2019 году – по государственной программе Республики Карелия «Развитие образования» (49,7 процента). Наименьший объем межбюджетных трансфертов в 2019-2020 годах был предусмотрен по государственной программе Республики Карелия «Развитие культуры» (менее 1 процента).

Плановый объем межбюджетных трансфертов распределен между всеми 18 муниципальными районами (городскими округами) Республики Карелия (приложения 25 и 26 к настоящему отчету). Наибольший объем предусмотрен Петрозаводскому городскому округу (45,6 процента – в 2020 году, 57,4 процента – в 2019 году). Кроме того, в 2020 году 8,5 процента и 7,9 процента от общего объема запланировано Пряжинскому муниципальному району и Суоярвскому муниципальному району соответственно; в 2019 году 9,9 процента и 9,2 процента – Сортавальскому муниципальному району и Прионежскому муниципальному району соответственно. Наименьший объем в 2019-2020 годах предусмотрен Костомукшскому городскому округу.

В 2020 году расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия составили по состоянию на 01.10.2020 1 244 392,1 тыс. рублей (в том числе за счет федеральных средств – 1 120 292,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Карелия – 124 099,3 тыс. рублей), на 01.01.2021 – 2 832 955,1 тыс. рублей (в том числе за счет федеральных средств – 2 537 951,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Карелия – 295 004,0 тыс. рублей). Расходы в целом за 2020 год превышают аналогичные расходы 2019 года на 968 338,8 тыс. рублей (или на 51,9 процента). При этом по сравнению с 2019 годом в 2020 году возросли расходы за счет средств федерального бюджета на 984 371,8 тыс. рублей (или на 63,4 процента); расходы за счет средств бюджета Республики Карелия снизились на 16 032,8 тыс. рублей (или на 5,2 процента).

В 2020 году межбюджетные трансферты составили 28,4 процента от общего объема расходов на реализацию национальных проектов; в 2019 году данный показатель был незначительно ниже – 26,2 процента.

Сводные данные о расходах на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия за 2019-2020 годы представлены в таблице 10.

Таблица 10

Региональный проект	Плановые значения (тыс. рублей)		Исполнение (тыс. рублей)			% исполнения		
	2019 год	2020 год	2019 год	на 01.10.2020	на 01.01.2021	2019 год	на 01.10.2020 (к Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020)	на 01.01.2021
Культурная среда (A1)	19 035,8	10 000	19 035,8	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Современная школа (E1)	11 743,0	0	11 743,0	0	0	100,0	X	X
Успех каждого ребенка (E2)	21 842,7	23 377,5	21 842,7	16 994,2	22377,5	100,0	72,7	95,7
Формирование комфортной городской среды (F2)	245 890,6	190 503,6	191 890,6	61 941,9	190 503,6	78,0	26,9	100,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (F3)	320 268,8	1 226 395,4	257 214,4	619 814,6	1 106 709,5	80,3	42,1	90,2
Чистая вода (G5)	43 468,4	936,1	43 468,4	936,1	936,1	100,0	100,0	100,0
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (P2)	1 165 110,4	875 207,4	737 317,4	97 432,9	747 470,1	63,3	11,1	85,4
Спорт - норма жизни (P5)	45 551,3	166 192,6	42 851,2	127 816,0	166 186,0	94,1	75,6	100,0
Дорожная сеть (R1)	540 012,0	592 545,0	539 252,8	309 456,4	588 772,3	99,9	53,4	99,4
Итого	2 412 923,0	3 085 157,6	1 864 616,3	1 244 392,1	2 832 955,1	77,3	37,0	91,8
в том числе								
субсидии	1 266 314,9	2 469 735,2	772 767,4	914 355,1	2 221 732,6	61,0	33,6	90,0
иные межбюджетные трансферты	1 146 608,1	615 422,4	1 091 848,9	330 037,0	611 222,5	95,2	51,5	99,3

Согласно таблице 10 уровень исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 01.01.2020 в целях предоставления межбюджетных трансфертов, составил 77,3 процента. Уровень исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели на 2020 год, составил по состоянию на 01.10.2020 37,0 процента, на 01.01.2021 – 91,8 процента, то есть выше уровня 2019 года на 14,5 процентных пункта.

Низкий уровень исполнения по состоянию на 01.10.2020 (37,0 процента по сравнению с плановыми показателями на указанную дату) свидетельствует о неравномерности освоения бюджетных средств в течение 2020 года, что являлось риском невыполнения мероприятий и неосвоения бюджетных средств в целом за год. Указанные тенденция и возможные риски были также отмечены Контрольно-счетной палатой по результатам мониторинга, проведенного по итогам 2019 года. За 9 месяцев 2020 года низкое исполнение сложилось по региональным проектам

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (11,1 процента) и «Формирование комфортной городской среды» (26,9 процента).


В целом за 2020 год уровень исполнения бюджетных ассигнований в разрезе региональных проектов колеблется от 85 до 100 процентов. Из 8 реализуемых в 2020 году региональных проектов полностью выполнены 3 региональных проекта («Культурная среда», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода»), по двум проектам исполнение выше 99 процентов («Спорт – норма жизни», «Дорожная сеть»).

Значительно изменился в анализируемом периоде уровень исполнения по субсидиям: в 2020 году он составил 90,0 процента против 61,0 процента в 2019 году. По состоянию на 01.10.2020 исполнение субсидий составило 33,6 процента, что также свидетельствует о неравномерности расходования бюджетных средств. По иным межбюджетным трансфертам уровень исполнения в 2020 году составил 99,3 процента (в 2019 году он был в размере 95,2 процента). По состоянию на 01.10.2020 были исполнены 51,5 процента предусмотренных иных межбюджетных трансфертов.

Подробный анализ исполнения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в разрезе национальных и региональных проектов представлен в приложениях 24, 25 к настоящему отчету.

Структура расходов по региональным проектам представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

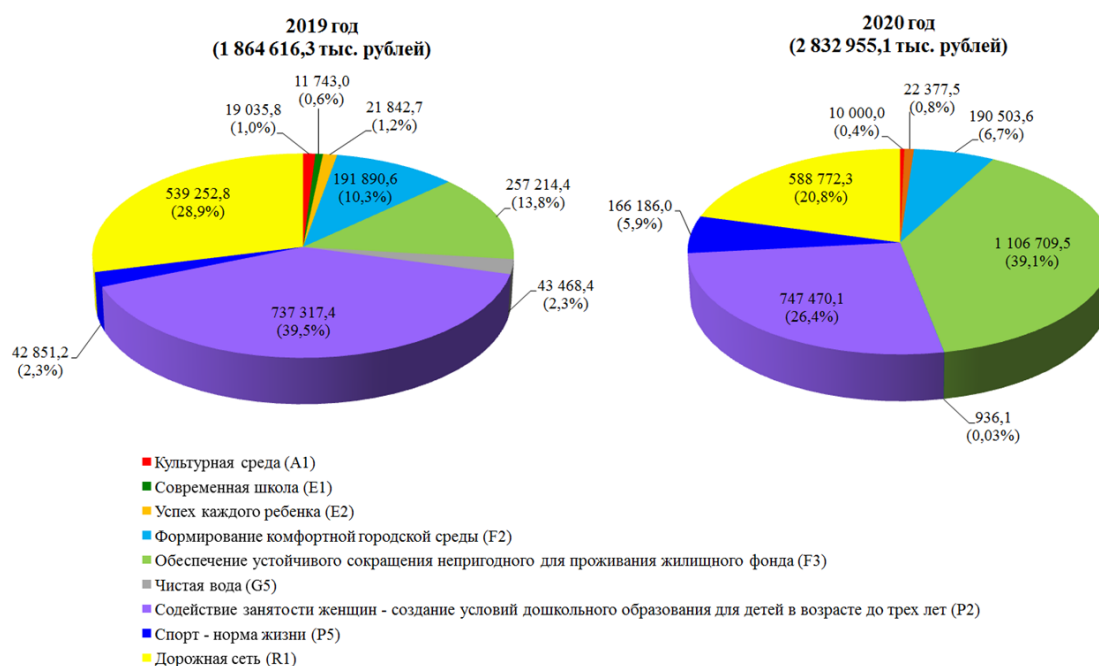

Структура межбюджетных трансфертов претерпела изменения в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Наибольший объем расходов произведен в 2020 году в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (39,1 процента), доля которого возросла почти в 4 раза, а объем расходов увеличился в 4,3 раза. В 2019 году наибольшим по расходам проектом был региональный проект «Содействие

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (39,5 процента), в 2020 году его доля в общем объеме межбюджетных проектов снизилась до 26,4 процента.

В части межбюджетных трансфертов значительно увеличился в 2020 году объем расходов по региональному проекту «Спорт – норма жизни» (в 3,9 раза). В 46,4 раза снизился объем расходов по региональному проекту «Чистая вода».

За 2020 год объем неисполненных бюджетных ассигнований на 01.01.2021 составил 252 202,5 тыс. рублей (8,2 процента от планового объема), что значительно ниже аналогичного объема за 2019 год (на 54,0 процента ниже). За 2020 год из 5 выполненных не полностью региональных проектов наибольшее невыполнение сложилось по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в части субсидий на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 127 737,3 тыс. рублей (также как и в 2019 году, когда сумма невыполнения по проекту составила 427 793,0 тыс. рублей); наименьшее невыполнение – по региональному проекту «Спорт – норма жизни».

Не освоены в 2020 году в полном объеме бюджетные ассигнования по двум направлениям:

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей были предусмотрены Министерству образования Республики Карелия для предоставления Петрозаводскому городскому округу и Сортавальскому муниципальному району; соглашения с указанными муниципальными образованиями были расторгнуты в декабре 2020 года);

- субсидии на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (средства в сумме 8 636,5 тыс. рублей были предусмотрены Министерству образования Республики Карелия для предоставления Петрозаводскому городскому округу; соглашение расторгнуто в декабре 2020 года).

В 2019 году таким направлением были иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (средства в сумме 54 000,0 тыс. рублей были предусмотрены Сортавальскому муниципальному району с целью реализации указанных мероприятий в 2019-2020 годах).

98,3 процента от объема неисполненных бюджетных ассигнований за 2020 год составляют субсидии, 1,7 процента – иные межбюджетные трансферты.

Сводные данные о расходах на предоставление межбюджетных трансфертов в разрезе главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия за 2020 год представлены в таблице 11.

Таблица 11
(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Плановый объем межбюджетных трансфертов	Исполнено			Объем неисполненных бюджетных ассигнований
		сумма	% исполнения	Удельный вес в общем объеме расходов, %	
Министерство образования Республики Карелия	898 584,9	769 847,6	85,7	27,2	128 737,3
Министерство культуры Республики Карелия	10 000,0	10 000,0	100,0	0,3	0,0
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	1 417 835,1	1 298 149,2	91,6	45,8	119 685,9
Министерство спорта Республики Карелия	166 192,6	166 186,0	100,0	5,9	6,6
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия	592 545,0	588 772,3	99,4	20,8	3 772,7
Итого	3 085 157,6	2 832 955,1	91,8	100,0	252 202,5

Наибольший объем расходов в 2020 году произведен Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (45,8 процента от всех расходов); уровень исполнения – 91,6 процента.

Полностью выполнили плановый объем Министерство культуры Республики Карелия и Министерство спорта Республики Карелия.

Наименьший уровень исполнения и наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований допущен Министерством образования Республики Карелия.

Подробный анализ исполнения межбюджетных трансфертов в 2020 году в части главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия представлен в приложении 27, в части государственных программ – в приложении 28 к настоящему отчету.

Сводные данные о расходах на предоставление межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований за 2019-2020 годы представлены в таблице 12.

Таблица 12
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования	Исполнено						Объем неисполненных бюджетных ассигнований	
	2019 год			2020 год			2019 год	2020 год
	сумма	% исполнения	Удельный вес в общем объеме расходов, %	сумма	% исполнения	Удельный вес в общем объеме расходов, %		
Петрозаводский городской округ	1 190 121,8	85,9	63,8	1 280 073,4	90,9	45,2	195 385,8	127 813,0
Костомукшский городской округ	5 314,8	100,0	0,3	2 472,6	100,0	0,1	0,0	0,0
Беломорский муниципальный район	55 027,0	72,5	3,0	176 134,5	98,6	6,2	20 823,5	2 553,5
Калевальский муниципальный район	3 325,8	100,0	0,2	11 204,0	100,0	0,4	0,0	1,9
Кемский муниципальный район	35 181,4	66,2	1,9	92 868,2	99,7	3,3	17 997,7	325,9
Кондопожский муниципальный район	156 845,8	87,5	8,4	197 161,1	99,1	7,0	22 335,4	1 846,7

Наименование муниципального образования	Исполнено						Объем неисполненных бюджетных ассигнований	
	2019 год			2020 год			2019 год	2020 год
	сумма	% исполн ения	Удель ный вес в общем объеме расход ов, %	сумма	% исполн ения	Удель ный вес в общем объеме расход ов, %		
Лахденпохский муниципальный район	28 302,2	99,9	1,5	51 233,8	100,0	1,8	21,5	0,0
Лоухский муниципальный район	7 428,7	100,0	0,4	49 190,1	99,5	1,7	0,0	249,8
Медвежьегорский муниципальный район	13 092,4	100,0	0,7	87 076,9	89,1	3,1	0,0	10 670,5
Муезерский муниципальный район	2 318,5	100,0	0,1	14 483,5	88,6	0,5	0,0	1 868,6
Олонецкий муниципальный район	10 273,1	100,0	0,6	31 008,8	100,0	1,1	0,0	0,4
Питкярантский муниципальный район	11 574,2	100,0	0,6	76 313,6	92,7	2,7	-0,1	5 984,5
Прионежский муниципальный район	221 509,3	100,0	11,9	88 638,9	99,5	3,1	0,0	453,0
Пряжинский муниципальный район	16 117,5	12,1	0,9	258 779,2	98,6	9,1	117 049,3	3 801,3
Пудожский муниципальный район	13 477,0	100,0	0,7	46 914,1	95,4	1,7	0,0	2 243,3
Сегежский муниципальный район	14 444,7	100,0	0,8	26 833,0	90,3	0,9	0,0	2 870,9
Сортавальский муниципальный район	67 298,7	28,1	3,6	152 485,1	79,6	5,4	171 993,5	39 153,7
Суоярвский муниципальный район	12 963,4	82,8	0,7	190 084,1	78,4	6,7	2 700,1	52 365,7
Итого	1 864 616,3	77,3	100,0	2 832 955,1	91,8	100,0	548 306,7	252 202,5

Участие в реализации национальных проектов с учетом финансирования из бюджета Республики Карелия в анализируемом периоде приняли все 18 муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия. Наибольший объем расходов на реализацию национальных проектов за счет межбюджетных трансфертов в анализируемом периоде был произведен Петрозаводским городским округом; в 2020 году доля расходов данного муниципального образования в общем объеме расходов снизилась на 18,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.

В 2019 году 10 муниципальных районов полностью исполнили предусмотренные бюджетные ассигнования; в 2020 году их количество снизилось до 4 единиц.

Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований:

- в 2019 году: у Петрозаводского городского округа, Сортавальского и Пряжинского муниципальных районов;

- в 2020 году: у Петрозаводского городского округа, Суоярвского и Сортавальского муниципальных районов.

Подробный анализ исполнения межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями за 2019-2020 годы представлен в приложениях 25, 26 к настоящему отчету.

По результатам мониторинга Контрольно-счетной палатой установлены факты несоответствия объемов кассовых расходов, отраженных в отчетах о ходе реализации отдельных региональных проектов за 2020 год, размещенных в информационной системе проектной деятельности по состоянию на 01.03.2021,

данным отчета по ф.0503117-НП, представленного в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия¹.

Так, в отчете о ходе реализации регионального проекта за 2020 год «Чистая страна» в разделе «Сведения об исполнении бюджета» объем финансового обеспечения (графы «Предусмотрено паспортом регионального проекта», «Сводная бюджетная роспись», «Лимиты бюджетных обязательств»), «Кассовое исполнение» указано «0,0» тыс. рублей, при этом по данным отчета по ф.0503117-НП исполнено расходов 2 458,5 тыс. рублей.

Также неверно отражено кассовое исполнение за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по региональным проектам «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Формирование комфортной городской среды».

Информация представлена в таблице 13.

Таблица 13

(тыс. рублей)

Наименование	Кассовое исполнение согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2020 год	Исполнено за 2020 год по данным отчета по ф.0503117-НП	Отклонение
«Чистая страна»			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе	0,0	2 458,5	2 458,5
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	2 458,5	2 458,5
бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	2 458,5	2 458,5
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе	40 000,0	89 036,1	49 036,1
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	40 000,0	89 036,1	49 036,1
бюджет субъекта Российской Федерации	40 000,0	89 036,1	49 036,1
«Формирование комфортной городской среды»			
бюджет субъекта Российской Федерации	190 503,6	230 631,5	40 127,9

Кроме того, в отчете о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2020 год допущены отдельные ошибки. Информация представлена в таблице 14.

Таблица 14

(тыс. рублей)

Наименование	Сводная бюджетная роспись, ЛБО, исполнение согласно отчету о ходе реализации рег. проекта за 2020 год	Подлежит отражению	Отклонение
«Формирование комфортной городской среды»			
бюджет субъекта Российской Федерации	190 503,6	230 631,5	40 127,9
бюджеты муниципальных образований	241 229,4	201 101,5	- 40 127,9

¹ Формируется в соответствии с Инструкцией № 191н, начиная с отчетности на 01.10.2019.

В целом расходы за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия на реализацию региональных проектов за 2020 год составили 10 033 399,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Республики Карелия – 9 989 966,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета (с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 6 708 506,4 тыс. рублей, средств бюджета Республики Карелия – 3 281 459,6 тыс. рублей);

бюджетов муниципальных образований – 43 433,5 тыс. рублей¹ (расходы в объеме 10 597,9 тыс. рублей произведены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», в объеме 19 421,2 тыс. рублей - по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», в объеме 13 414,4 тыс. рублей - по федеральному проекту «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

(По итогам исполнения мероприятий региональных проектов за 2019 год расходы за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия на указанные цели составили 7 166 825,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджетов муниципальных образований – 49 802,7 тыс. рублей² (в том числе по региональным проектам: «Культурная среда» национального проекта «Культура» - 286,5 тыс. рублей; «Современная школа» - 3 747,0 тыс. рублей, «Успех каждого ребенка» - 3 724,6 тыс. рублей (национальный проект «Образование»); «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - 16 508,9 тыс. рублей; «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - 166,8 тыс. рублей, «Спорт - норма жизни» - 9 928,2 тыс. рублей (национальный проект «Демография»); «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 15 440,7 тыс. рублей).

Согласно информации главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия возвраты в 2021 году в федеральный бюджет межбюджетных трансфертов вследствие нарушений обязательств по достижению установленных значений показателей результативности их использования по итогам за 2020 год не осуществлялись. Наряду с этим, Министерством спорта Республики Карелия в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 777-09-2019-025 на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» произведен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 793,8 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Медвежьегорск»; платежное поручение № 16789 от 29.01.2021).

¹ Согласно данным отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2020 год, размещенных в информационной системе проектной деятельности по состоянию на 01.03.2021.

² Согласно информации, представленной Правительством Республики Карелия по итогам за 2019 год.

1.4. Оценка фактического достижения запланированных показателей и результатов региональных проектов (мониторинг отчетности о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.01.2021, выборочно).

2019 год

В рамках реализации 10 национальных проектов для Республики Карелия на 2019 год паспортами 47 региональных проектов, отчетами о ходе реализации региональных проектов за 2019 год отражены 199 целевых показателей, из них на 2019 год значения установлены по 163 показателям, по 36 показателям значения не установлены.

Из 36 показателей 15 предусмотрены в рамках 8 региональных проектов, реализуемых в период с 2021 по 2024 годы (и, соответственно, значения на 2019 год не установлены ни по одному показателю данных проектов):

«Цифровая культура» (показатели установлены с 2021 года);

«Кадры для цифровой экономики» (показатели установлены с 2020 года);

«Информационная безопасность» (показатели установлены с 2020 года);

«Цифровые технологии» (показатели установлены с 2020 года);

«Учитель будущего» (показатели установлены с 2024 года);

«Чистая страна» (показатели установлены с 2022 года);

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (показатели установлены с 2020 года).

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (показатели установлены с 2021 года).

В соответствии с представленными отчетами о ходе реализации региональных проектов по итогам за 2019 год из 163 целевых показателей, плановые значения по которым установлены:

1) выполнены (в том числе по отдельным позициям - перевыполнены) 107 установленных показателей (или 65,7 процента от указанного количества);

2) не достигнуты целевые значения по 13 показателям (8,0 процента) в рамках мероприятий следующих региональных проектов:

«Цифровая образовательная среда»:

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам (план – 1 процент, факт – 0 процентов) (отмечаем, что согласно отчету по госпрограмме за 2019 год показатель выполнен; в отчете о ходе реализации регионального проекта за 2020 год по позиции «фактическое значение за предыдущий год» (2019) выполнение показателя не значится);

- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования (план – 3 процента, факт – 0 процентов);

«Формирование комфортной городской среды» - среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации (план – 165 усл. ед., факт - 162 усл. ед. (или 98,2 процента), при одновременном указании процента исполнения - «100,0 процента»);

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

- смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения (план - 41,7 человек, факт - 44,9 человек);

- смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения (план - 92,2 человек, факт - 101 человек);

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (план - 66,5 процента, факт - 78,5 процента);

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:

- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (план - 6 872 человека, факт - 6 000 человек);

- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (план - 170 человек, факт - 121 человек);

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (план - 99,0 процента, факт - 89,5 процента);

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»:

- объем экспорта зерновых (план - 1,000 млн долларов США, факт - 0,6 млн долларов США) (отмечаем, что согласно отчету по госпрограмме за 2019 год показатель выполнен; в отчете о ходе реализации регионального проекта за 2020 год по позиции «фактическое значение за предыдущий год» (2019) выполнение показателя - 0,7 млн долларов США);

- объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (план - 8,0 млн долларов США, факт - 7,0 млн долларов США; при этом, согласно отчету по госпрограмме за 2019 год показатель выполнен; в отчете за 2020 год по позиции «фактическое значение за предыдущий год» выполнение показателя - 7,7 млн долларов США);

- объем экспорта рыбы и морепродуктов (план - 128,0 млн долларов США, факт - 83,2 млн долларов США; в отчете о ходе реализации регионального проекта за 2020 год по позиции «фактическое значение за предыдущий год» выполнение показателя - 87,2 млн долларов США);

- объем экспорта продукции АПК (план - 137,0 млн долларов США, факт - 90,8 млн долларов США; в отчете о ходе реализации регионального проекта за 2020 год по позиции «фактическое значение за предыдущий год» выполнение показателя - 95,6 млн долларов США);

3) паспортами отдельных региональных проектов установлено 33 целевых показателя (или 20,2 процента), выполнение которых не отражено в отчетах (в том числе в случаях отсутствия на 01.01.2020 официальных статистических данных): «Поддержка семей, имеющих детей» (1 показатель), «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (1 показатель), «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (1 показатель), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (1 показатель), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (22

показателя), «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)» (1 показатель) и «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» (3 показателя), а также 3 показателя по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (факт по показателям: коэффициенты рождаемости в возрастных группах 25-29 лет и 30-34 лет, суммарный коэффициент рождаемости указан как «0,0», при этом, фактическое значение (уточненное) определяется Росстатом);

4) отчеты по установленной форме не представлены по трем региональным проектам, в которых плановые значения на 2019 год учтены по 10 показателям (или 6,1 процента): «Ипотека» (паспортом плановые значения на 2019 год установлены по 2 показателям; согласно информации Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, поскольку соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Республикой Карелия о реализации регионального проекта «Ипотека» на территории Республики Карелия не заключалось, отчет не формируется); «Сохранение уникальных водных объектов» (из 4 показателей значения на 2019 год установлены по 3 показателям); «Экспорт услуг» (из 9 показателей по 5 установлены значения на 2019 год);

2020 год

В соответствии показателями в рамках 50 региональных проектов по 11 национальным проектам (на основании 48 отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.01.2021) из 234 показателей плановые значения на 2020 год установлены по 193 показателям (и, соответственно, по 41 показателю значения не установлены).

В соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов по итогам 2020 года из 193 целевых показателей:

1) выполнены (в том числе по отдельным позициям - перевыполнены) 169 установленных показателей (или 87,6 процента от указанного количества);

2) отражены как не достигнутые целевые значения по 18 показателям, из них 13 показателей (6,7 процента) фактически не выполнены, по 5 показателям¹ (2,6 процента) при заполненных значениях, указывающих на неисполнение плановых значений в 2020 году, в пояснениях отражено достижение показателей,

в том числе:

«Формирование комфортной городской среды» - реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом (план – 2 ед., факт – 1 ед.; как указано выше, сроки достижения показателя продлены до 01.09.2021);

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»:

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в

¹ Учтены 2 показателя по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 3 показателя по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (план - 0,0431 процента, факт – 0,0 процента);

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (план - 0,079 процента, факт – 0,0 процента);

«Чистая вода»:

- доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (план - 75,3 процента, факт - 66,7 процента);

- доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (план - 84,1 процента, факт - 73,6 процента)

(при этом, по двум вышеуказанным показателям в отчете указано, что достижение показателей за 2020 год не представляется в связи с уточнением Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия базовых значений показателей и корректировкой плановых значений на последующие периоды);

«Системные меры по повышению производительности труда» - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году (план - 102,9 процента, факт - 0,0 процента; согласно отчету неисполнение показателя связано с ухудшением финансового состояния организаций из-за введенных ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекцией);

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (план - 66,5 процента, факт - 85,7 процента);

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами (план - 88,6 процента, факт - 81,5 процента);

- обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) (план - 102,4 процента, факт - 93,3 процента);

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:

- количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (ТВСП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации (план – 142 единицы, факт – 137 единиц; отмечаем, что согласно пояснений, указанных в отчете, при вводе значения планового показателя на 2020 год допущена техническая ошибка (план – 85), фактически показатель выполнен);

- количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи,

подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации (план – 93 единицы, факт – 81 единица; при этом, согласно пояснений по отчету, при вводе значения планового показателя на 2020 год допущена техническая ошибка (план – 70), фактически показатель выполнен);

- количество государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (план – 70 единиц, факт – 0 единиц);

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - по трем показателям отражено неисполнение (при наличии пояснений о выполнении показателей):

- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (план - 6 300 человек, факт - 4 844 человек);

- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (план – 120 человек, факт – 20 человек);

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (план - 99,0 процента, факт - 98,68 процента);

одновременно в отчете представлены пояснения о заключении дополнительного соглашения от 25.12.2020, корректирующего плановые значения (до следующих величин соответственно: 4 411 человек; 11 человек; 85,3 процента), и сделан вывод о выполнении в полном объеме целевых показателей);

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»:

- объем экспорта продукции АПК (план - 0,176 млрд. долл. США, факт - 0,1273 млрд. долл. США);

- объем экспорта зерновых (план - 0,001 млрд. долл. США, факт - 0,0007 млрд. долл. США);

- объем экспорта рыбы и морепродуктов (план - 0,167 млрд. долл. США, факт - 0,1087 млрд. долл. США);

3) отчеты по установленной форме не представлены по двум региональным проектам, в которых плановые значений на 2020 год учтены по 6 показателям (или 3,1 процента): «Ипотека» (2 показателя), «Сохранение уникальных водных объектов» (4 показателя).

Согласно предоставленной главными распорядителями бюджетных средств информации о достижении муниципальными образованиями показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов соглашениями с муниципальными образованиями были установлены 29 показателей результативности на 2019 год и 34 показателя - на 2020 год. Сведения об их

выполнении представлены в приложении 30 (2019 год) и приложении 31 (2020 год) к настоящему отчету соответственно.

За 2019 год из 29 установленных показателей 25 показателей исполнены на уровне 100 процентов всеми муниципальными образованиями – получателями соответствующего межбюджетного трансферта. Следующие 3 показателя исполнены полностью, при этом по отдельным муниципальным образованиям имеется превышение плановых значений:

- «доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды», субсидия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды) – по 34 муниципальным образованиям (из 49 получателей субсидии) плановые значения превышены, по 15 муниципальным образованиям – на уровне 100,0 процента;

- «доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» (региональный проект «Спорт – норма жизни», субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» в целях развития системы спортивной подготовки) – по всем 5 получателям субсидии исполнение свыше 100,0 процента;

- «нанесение дорожной разметки» (региональный проект «Дорожная сеть», иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в муниципальных образованиях) – по Петрозаводскому городскому округу показатель исполнен с превышением планового значения.

По одному показателю результативности «количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда» (региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ) в 2019 году из 6 получателей субсидии 2 муниципальных образования (Лахденпохский и Пряжинский муниципальные районы) плановые значения не достигли (уровень исполнения 92,0 процента и 66,8 процента соответственно), остальные 4 получателя перевыполнили установленные значения.

В 2020 году фактические значения 24 показателей результативности (из 34 установленных) не имеют отклонений от плановых значений по всем муниципальным образованиям – получателям соответствующего межбюджетного трансферта.

По 3 показателям в рамках субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды (региональный проект «Формирование комфортной городской среды»):

- «прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году»;

- «доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов»;

- «количество городов с благоприятной городской средой»,

Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в качестве сведений об их исполнении указано, что значение данных показателей будет рассчитано Минстроем России до 1 апреля 2021 года.

Следующие 4 показателя исполнены в 2020 году полностью, при этом по отдельным муниципальным образованиям имеется превышение плановых значений:

- «доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», субсидия на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования) – по 3 муниципальным образованиям (из 4 получателей субсидии) плановые значения превышены, по 1 муниципальному образованию – на уровне 100,0 процента;

- «доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования) – по Прионежскому муниципальному району показатель перевыполнен;

- «доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» (региональный проект «Спорт – норма жизни», субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта» в целях развития системы спортивной подготовки) - по всем 6 получателям субсидии исполнение свыше 100,0 процента;

- «обучены плаванию в рамках пилотного проекта «Умею плавать» (региональный проект «Спорт – норма жизни», субсидия на реализацию проекта «Умею плавать») – по Питкярантскому муниципальному району показатель перевыполнен.

Показатель «доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» (региональный проект «Формирование

комфортной городской среды», субсидия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды) в 2020 году не достигнут 8 муниципальными образованиями (из 50 получателей субсидии). Уровень исполнения колеблется от 0 процентов до 91,3 процента. По Сосновецкому сельскому поселению исполнение составило 0,0 процента, при этом предоставленные из бюджета Республики Карелия средства субсидии израсходованы в полном объеме.

По показателю «количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда» (региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ) в 2020 году из 17 получателей субсидии 2 муниципальных образования (Кондопожский и Лахденпохский муниципальные районы) плановые значения не достигли (уровень исполнения 80,9 процента и 59,5 процента соответственно), остальные 15 получателей перевыполнили установленные значения. Кондопожским и Лахденпохским муниципальными районами предоставленные из бюджета Республики Карелия средства субсидии израсходованы в полном объеме.

Не выполнен показатель «реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» (иные межбюджетные трансферты Сортавальскому городскому поселению в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»).

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов (направлены письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 25.08.2020 № П6-51690) участие органов местного самоуправления в реализации региональных проектов осуществляется, в том числе, посредством участия органов местного самоуправления в органах управления проектной деятельностью субъектов Российской Федерации. Согласно представленной главными распорядителями бюджетных средств информации о комиссиях, рабочих группах (региональных, межведомственных и т.п.), созданных в целях реализации региональных проектов и контроля за их исполнением, следующими главными распорядителями не включен в состав рабочих групп по реализации региональных проектов, реализация которых предполагает предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, ни один из представителей муниципальных образований Республики Карелия:

Министерство культуры Республики Карелия – по региональному проекту «Культурная среда»;

Министерство образования Республики Карелия – по региональному проекту «Успех каждого ребенка»;

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия – по региональным проектам «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода»;

Министерство спорта Республики Карелия – по региональному проекту «Спорт – норма жизни».

2. Оценка законности и результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах на реализацию на территории Республики Карелия региональных проектов (выборочно, по итогам проведенных муниципальными контрольно-счетными органами Республики Карелия экспертно-аналитических и контрольных мероприятий).

Комплексная реализация на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей национальных проектов, определенных Указом № 204, невозможна без активного участия в данной работе органов местного самоуправления (в том числе в части результатов, достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований).

Методические рекомендации по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов (как указано выше) направлены письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 25.08.2020 № П6-51690.

В анализируемом периоде органы местного самоуправления Республики Карелия участвовали в реализации на территориях муниципальных образований мероприятий региональных проектов по следующим направлениям (национальным проектам):

культура, образование, жилье и городская среда, экология, демография, безопасные и качественные автомобильные дороги – с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия (в 2019 году межбюджетные трансферты предусмотрены по 9 региональным проектам, в 2020 году – по 8 региональным проектам);

здравоохранение, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт – в рамках заключенных с органами исполнительной власти Республики Карелия соглашений о реализации отдельных мероприятий региональных проектов (без предоставления целевых средств из бюджета Республики Карелия).

С целью проведения выборочной оценки законности, результативности и эффективности использования средств федерального и регионального бюджетов, средств местного бюджета (в случае их использования), направленных на финансовое обеспечение в рамках реализации региональных проектов, а также анализа и контроля за ходом реализации региональных проектов на территории республики Контрольно-счетной палатой во исполнение подписанных с восемью контрольно-счетными органами (далее – КСО) муниципальных образований (Контрольно-счетной палатой Петрозаводского городского округа, Контрольно-счетными органами Костомукшского городского округа, Кондопожского муниципального района, Контрольно-счетными комитетами Беломорского, Прионежского, Сегежского и Сортавальского муниципальных районов, Контрольно-счетной комиссией Кемского муниципального района) проведено параллельное мероприятие.

Форма проведения, объекты, сроки и методы проведения мероприятия определены КСО муниципальных образований самостоятельно. Так, Контрольно-счетной палатой Петрозаводского городского округа, Контрольно-счетными комитетами Беломорского и Сегежского муниципальных районов, Контрольно-счетным органом Кондопожского муниципального района мероприятия проведены в форме экспертно-аналитических мероприятий, Контрольно-счетными

комитетами Прионежского и Сортавальского муниципальных районов, Контрольно-счетной комиссией Кемского муниципального района – в форме контрольных мероприятий, Контрольно-счетным органом Костомукшского городского округа проведены тематические экспертно-аналитическое и контрольное мероприятия.

Информация представлена в таблице 15.

Таблица 15

Наименование контрольно-счетного органа	Форма проведения	Наименование национального проекта / федерального (регионального) проекта	Проверяемый период
Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа	Экспертно-аналитическое мероприятие (аудит в сфере закупок)	«Демография» / «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	2019 год и истекший период 2020 года (по состоянию на 01.09.2020)
Контрольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Экспертно-аналитическое мероприятие	Проверка законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию на территории Республики Карелия региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года выборочно проектов	2019 год - 9 месяцев 2020 года
	Контрольное мероприятие	«Образование» / «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»	2019 год - 9 месяцев 2020 года
Контрольно-счетный комитет Беломорского муниципального района	Экспертно-аналитическое мероприятие	«Образование» / «Успех каждого ребенка»	2019 год и истекший период 2020 года (по состоянию на 01.09.2020)
Контрольно-счетная комиссия Кемского муниципального района	Контрольное мероприятие	«Жилье и городская среда» / «Формирование комфортной городской среды»	2019 год - 6 месяцев 2020 года
Контрольно-счетный орган Кондопожского муниципального района	Экспертно-аналитическое мероприятие	«Культура» / «Культурная среда»	2019 год
Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района	Контрольное мероприятие	«Демография» / «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	2019 год
Контрольно-счетный комитет Сегежского муниципального района	Экспертно-аналитическое мероприятие	Мониторинг и контроль разработки и реализации региональных составляющих федеральных (национальных) проектов, в том числе анализ финансового обеспечения региональных составляющих федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»	2019 год и истекший период 2020 года (по состоянию на 01.09.2020)
Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района	Контрольное мероприятие	«Образование» / «Успех каждого ребенка»	2019 год

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСО муниципальных образований проведены как тематические мероприятия, так и мониторинг реализации мероприятий региональных проектов на территории муниципальных образований. Информация о мероприятиях представлена в таблице 16.

Таблица 16

Наименование КСО	Наименование НП/ФП (РП)	Мероприятия (объекты)	
Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа	«Демография» / «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Строительство детских садов в г.Петрозаводске: - на 300 мест в районе ул. Хейкконена, - на 150 мест в районе ул. Генерала Судакова, - на 150 мест в районе ул. Энтузиастов, - на 300 мест в районе ул.Чехова.
Контрольно-счетный орган	В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен мониторинг реализации на территории Костомукшского городского округа региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в 2019 году и за 9 месяцев 2020		

Наименование КСО	Наименование НП/ФП (РП)	Мероприятия (объекты)	
муниципального образования «Костомукшский городской округ»	года.		
	«Образование» / «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»	Мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Приобретение оборудования для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа «Гимназия»
		Мероприятия по созданию (обновлению) материальной технической базы для основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа «Гимназия»
Контрольно-счетный комитет Беломорского муниципального района	«Образование» / «Успех каждого ребенка»	Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения (муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района «Летнереченская средняя общеобразовательная школа»)
Контрольно-счетная комиссия Кемского муниципального района	«Жилье и городская среда» / «Формирование комфортной городской среды»	Мероприятия по формированию современной городской среды на территории Кемского городского поселения	Благоустройство городского парка г.Кемь на ул.Каменева в 2019 году, благоустройство дворовых территорий в 2020 году
Контрольно-счетный орган Кондопожского муниципального района	«Культура» / «Культурная среда»	Мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Кондопожского муниципального района «Детская школа искусств»
Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района	«Демография» / «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Приобретение нового отдельно стоящего нежилого здания – «Строительство блока ясельных групп (дошкольное отделение) МОУ «Шуйская СОШ № 1» на 80 мест
		Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Приобретение нового отдельно стоящего нежилого здания – блок дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» на 200 мест
Контрольно-счетный комитет Сеgezского муниципального района	«Жилье и городская среда» / «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; «Образование» / «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»	Мероприятия по формированию комфортной городской среды	В 2019 году выполнение работ по устройству покрытия пешеходных дорожек на аллее им. Л.Д.Катанандова (г.Сеgezжа), в 2020 году - благоустройство территории сквера по ул.Советская д.6, благоустройство дворовых территорий, выполнение работ по благоустройству пустыря по ул. Строителей в пгт. Надвоицы.
		Мероприятия по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда	приобретение 18 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
		Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом («Успех каждого ребенка»)	Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 (г.Сеgezжа)
		Мероприятия по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» («Современная школа»)	Ремонт помещений в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» (г.Сеgezжа), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа п.Надвоицы
		Мероприятия по созданию технических и информационных условий для использования Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды («Цифровая образовательная среда»)	по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» расходов не производилось
Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района	«Образование» / «Успех каждого ребенка»	Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Мероприятия по перепрофилированию имеющейся аудитории под спортивный зал для занятий физической культурой и спортом в МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ
			Мероприятия по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного сооружения МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ

В ходе проведенных мероприятий КСО муниципальных образований выявлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе при разработке и реализации муниципальных программ на территории муниципальных образований (городских и сельских поселений); при ведении бюджетного учета и отчетности об исполнении местных бюджетов; нарушения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Республики Карелия в рамках реализации Закона № 44-ФЗ, а также в ходе исполнения контрактов (договоров). Также отдельными КСО муниципальных образований отмечалось сохранение тенденции неравномерного освоения бюджетных ассигнований (низкого исполнения расходов на реализацию мероприятий региональных проектов в течение I-III кварталов).

Так, в соответствии с Соглашениями, заключенными между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по строительству детских садов в рамках национального проекта «Демография», в дошкольных образовательных организациях города в течение 2020-2021 годов должно быть введено 900 мест. Для выполнения условий Соглашений Администрацией Петрозаводского городского округа предусмотрено строительство 4 детских садов: два по 300 мест в районе ул. Хейкконена и ул. Чехова, два по 150 мест в районе ул. Генерала Судакова и ул. Энтузиастов.

Контрольно-счетной палатой Петрозаводского городского округа в заключении о проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ заключения и исполнения муниципальных контрактов на строительство детских садов с целью создания дополнительных мест в системе дошкольного образования Петрозаводского городского округа в рамках реализации национального проекта «Демография» (аудит в сфере закупок)» указано, что исполнение по проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» за 2019 год составило 15,1 процента от общей суммы предусмотренных на 2019 год бюджетных ассигнований, по состоянию на 01.10.2020 – 19,4 процента от объема предусмотренных на 2020 год бюджетных ассигнований (при этом, процент исполнения кассовых расходов за период 2019 год - 01.10.2020 по отношению к объему заключенных контрактов на 01.10.2020 составил 26,1 процента, в том числе по контрактам со сроком исполнения до 31.12.2020 – 51,6 процента).

Низкий процент исполнения в 2019 году сложился по причинам признания несостоявшимся электронного аукциона, объявленного в конце 2019 года на строительство детского сада мощностью на 300 мест в районе ул. Хейкконена и позднего объявления (декабрь 2019 года) муниципальных закупок на строительство детских садов мощностью по 150 мест по ул. Генерала Судакова и ул. Энтузиастов в связи с получением проектно-сметной документации 29.10.2019 и 23.10.2019 соответственно.

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» за 2020 год по детским садам мощностью по 150 мест по ул. Генерала Судакова и ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; срок исполнения по мероприятию «строительство детского сада мощностью на 300 мест в районе ул. Хейкконена г. Петрозаводска» перенесен на 2021 год (прогнозируемый срок ввода объекта – август 2021 года; по

информации Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа кассовые расходы по данному объекту в соответствии с госконтрактом на 01.02.2021 составили 65,0 процента).

Мероприятие «Строительство детского сада на 300 мест в районе ул. Чехова в г. Петрозаводске» запланировано на 2021 год (Администрацией Петрозаводского городского округа 01.09.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по данному объекту; бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в рамках Соглашения между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа от 15.06.2020 о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования»).

Контрольно-счетный комитет Сегежского муниципального района в Заключении о результатах мониторинга и контроля разработки и реализации на территории Сегежского муниципального района муниципальных программ в рамках реализации региональных составляющих федеральных (национальных) проектов за 2019 год и истекшем периоде 2020 года отмечает неравномерное освоение бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на территории Сегежского и Надвоицкого городских поселений: кассовые расходы в 2019 году произведены только в IV квартале, в 2020 году по состоянию на 01.09.2020 кассовые расходы составили 9,0 процента от плановых показателей.

Расходы на реализацию мероприятий федеральных (национальных) проектов на территории Сегежского муниципального района в отчетном 2020 году по состоянию на 01.09.2020 в целом составили 25,8 процента от планового объема (ассигнования за счет средств бюджета Республики Карелия, средств местного бюджета), в том числе отмечено отсутствие кассовых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (межбюджетные трансферты на реализацию указанного регионального проекта муниципальным образованиям не предусмотрены).

Установлены факты неэффективного использования бюджетных средств (не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ законности и результативности использования средств бюджета Кондопожского муниципального района, направленных в 2019 году на реализацию на территории Кондопожского муниципального района мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств) в рамках реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» Контрольно-счетным органом Кондопожского муниципального района установлено, в том числе, следующее:

приобретенное для художественного отделения оборудование (муфельная печь стоимостью 60,0 тыс. рублей, печь для обжига стоимостью 120,0 тыс. рублей, гончарный круг стоимостью 30,0 тыс. рублей) с момента приобретения (29.10.2019) и на период проведения проверки (сентябрь 2020 года) не использовалось (что было связано, в том числе, с отсутствием помещения, соответствующего требованиям СанПиН и пожарной безопасности). Данный факт указывал на

возможное возникновение рисков недостижения установленных целей и показателей в рамках реализации национального проекта «Культура», а также на признаки неэффективного использования бюджетных средств (нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса). По оперативной информации КСО Кондопожского муниципального района приобретенное для художественного отделения оборудование с декабря 2020 года используется в соответствии с установленными целями (МОУ ДО «Детская школа искусств» был определен класс, в котором по требованиям СанПиН и пожарной безопасности были проведены необходимые дополнительные ремонтные и электромонтажные работы);

при проведении анализа предельных цен установлено их завышение по сравнению с нормативными затратами на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района, утвержденными постановлениями Администрации Кондопожского муниципального района; общая сумма расходов, предусмотренная контрактами (договорами) сверх рассчитанной по нормативам (на приобретение печи для обжига, цифрового микшера, софитов и смычков), в объеме 64,3 тыс. рублей, не соответствуют принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса.

Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального района проведено контрольное мероприятие «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Сортавальского муниципального района, направленных в 2019 году на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», выделенных Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Туокслахтинская основная общеобразовательная школа».

При проведении осмотра перепрофилированных под спортивные залы помещений (в которых был проведен ремонт потолка, стен, полов, замена окон, дверей) установлено, что в одном из помещений (спортивный зал на втором этаже здания площадью 47,4 кв.м.) имеется наличие протечки кровли, в результате чего в помещении присутствуют дефекты в виде нарушения штукатурного слоя на стыках потолочных плит и в местах сопряжения стен с плитами потолочного перекрытия, отслоение штукатурки на потолке и верхней части стен, трещины в швах между плитами потолочных перекрытий, следы протечек и ржавые пятна на поверхности потолка и стен.

Наличие нарушения целостности кровли влечет риск непригодности к использованию по функциональному назначению перепрофилированного под спортивный зал помещения, в связи с чем расходы на перепрофилирование, произведенные за счет субсидии из бюджета Республики Карелия и средств местного бюджета в общей сумме 274,7 тыс. рублей не соответствуют принципу эффективности, предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса; отмечен риск утраты достигнутого уровня целевого показателя «увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время».

Кроме того, помещения, перепрофилированные в МКОУ «Туокслахтинская основная общеобразовательная школа» под спортивные залы для занятия

физической культурой и спортом, не оборудованы раздевальными помещениями, что не соответствует требованиям пункта СанПиН.

По оперативной информации Контрольно-счетного комитета Сортавальского муниципального района по состоянию на 01.02.2021 ремонтные работы по устранению протечки кровли проведены силами работников учреждения, в январе 2021 года заключен договор на выполнение работ на изготовление проектно-сметной документации на устройство скатной кровли здания школы, с дальнейшим планированием выполнения работ.

Контрольно-счетной комиссией Кемского муниципального района при проведении контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Кемского городского поселения в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Кемского городского поселения за 2019 год и 6 месяцев 2020 года (выборочно)» выявлено, что приобретенные для установки на общественной территории (в городском парке) материальные запасы на общую сумму 118,8 тыс. рублей (щиты затвора, рама затвора щитового) на момент проведения мероприятия не монтированы, находятся на хранении в администрации Кемского муниципального района. Данный факт может содержать признаки неэффективного использования средств, поскольку работы по установке щита затвора и рамы затвора щитового не могут быть выполнены без проведения экологической экспертизы и согласования уполномоченных государственных органов (соответствующие заключения отсутствуют).

Администрацией Кемского муниципального района в рамках благоустройства городского парка приняты и оплачены результаты работ, выполненные ненадлежащим образом, на сумму 46,7 тыс. рублей, в том числе подрядчиком не произведены работы по устройству внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня, не установлены мусорные контейнеры (2 штуки) и скамьи (2 штуки). По оперативной информации в целях устранения указанных недостатков Администрацией района проводится претензионная работа.

Информация о выявленных муниципальными контрольно-счетными органами нарушениях и недостатках представлена в приложении 32 к настоящему отчету.

Выводы:

1. Проектная деятельность в Республике Карелия осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства, положениями Постановления № 64-П и др. нормативными правовыми актами Республики Карелия, принятыми в целях организации проектного управления в органах исполнительной власти Республики Карелия при реализации региональных составляющих национальных проектов, предусмотренных Указом № 204.

2. В 2020 году на территории Республики Карелия осуществлялась реализация 50 региональных проектов по одиннадцати направлениям стратегического развития Российской Федерации.

В ходе проводимой работы по корректировке национальных проектов, в том числе в рамках исполнения положений Указа № 474, реализация отдельных проектов в 2020 году завершена.

3. В реализации мероприятий региональных проектов, входящих в состав федеральных (национальных) проектов (программ), в 2019-2020 годах участвовали 12 органов исполнительной власти Республики Карелия. В целях обеспечения и

контроля за исполнением мероприятий региональных проектов созданы соответствующие комиссии, рабочие группы (в том числе региональные, межведомственные), в состав которых включены представители органов исполнительной власти Республики Карелия.

4. По результатам мониторинга информации о ходе реализации на территории республики мероприятий региональных проектов, размещаемой на официальном интернет-портале Республики Карелия и сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, установлено следующее:

4.1. информация, представленная на официальных сайтах органов исполнительной власти, не является единой по содержанию и комплексной;

4.2. у ряда органов исполнительной власти информация размещается не на главной странице сайта органа, что может вызвать у пользователей (граждан) определенные затруднения при поиске информации;

4.3. по состоянию на 01.03.2021 у большинства органов исполнительной власти Республики Карелия материалы о результатах реализации региональных проектов по итогам за 2020 год в целом отсутствуют;

4.4. исследования общественного мнения о реализации региональных проектов в анализируемом периоде органами исполнительной власти Республики Карелия не проводились. Наряду с этим, всеми органами исполнительной власти отмечено о достаточности информирования граждан о ходе реализации национальных проектов в Республике Карелия.

5. По информации органов исполнительной власти Республики Карелия при реализации отдельных региональных проектов имеются вопросы, требующие проработки (урегулирования), в том числе в части корректировки показателей, наличия дополнительной потребности в финансовом обеспечении (в том числе из федерального бюджета). Также по ряду показателей региональных проектов на отчетные даты отсутствуют данные официальной статистической отчетности.

6. По итогам анализа интеграции региональных проектов в государственные программы Республики Карелия Контрольно-счетная палата отмечает следующее:

6.1. наличие случаев несогласованности документов стратегического планирования в Республике Карелия, предусматривающих реализацию мероприятий региональных проектов;

6.2. отсутствие единообразного подхода при отражении (введении) целей, задач и показателей региональных проектов в государственных программах:

в соответствии с паспортами и отчетами о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.01.2020 из 199 целевых показателей (включая 36 показателей, значения которых на 2019 год не установлены), только 81 показатель (или 40,7 процента) отражен в государственных программах Республики Карелия (как целевой показатель, показатель результативности или показатель непосредственного результата);

по состоянию на 01.10.2020 из 229 целевых показателей (в том числе 33 показателя, значения которых на 2020 год не установлены), отраженных в отчетах ходе реализации региональных проектов за 9 месяцев 2020 года, 88 показателей (или 38,4 процента) учтены в государственных программах Республики Карелия.

6.3. В ряде случаев имеет место несоответствие наименований, единиц измерения, плановых и фактических значений показателей по отдельным мероприятиям, установленным региональными проектами и государственными программами.

7. Расходы на реализацию мероприятий федеральных (национальных) проектов составили:

за 2019 год - 7 117 023,1 тыс. рублей (14,2 процента от общих расходов бюджета Республики Карелия), или 87,8 процента от планового объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью на 01.01.2020, в том числе за счет средств федерального бюджета (с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 5 326 984,3 тыс. рублей, средств бюджета Республики Карелия – 1 790 038,8 тыс. рублей (расходы произведены по 30 федеральным проектам в рамках восьми национальных проектов);

за 2020 год - 9 989 966,0 тыс. рублей (14,8 процента от общих расходов бюджета Республики Карелия), или 85,3 процента от планового объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью на 01.01.2021 (профинансированы отдельные мероприятия 29 федеральных проектов в рамках девяти национальных проектов), в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 708 506,4 тыс. рублей, средств бюджета Республики Карелия – 3 281 459,6 тыс. рублей.

8. По итогам реализации региональных проектов в 2020 году объем неосвоенных ассигнований составил 1 716 132,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 1 256 458,7 тыс. рублей, средств бюджета Республики Карелия - 459 673,8 тыс. рублей (по итогам за 2019 год - 990 079,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 902 884,8 тыс. рублей).

Исполнение по национальному проекту «Образование» в 2019, 2020 годах составило 52,7 процента и 48,2 процента соответственно (с остатком неосвоенных ассигнований на 01.01.2020 – в объеме 369 193,5 тыс. рублей, на 01.01.2021 - 1 374 953,3 тыс. рублей); по национальному проекту «Демография» - в 2019 году – 77,6 процента (неосвоено 488 436,4 тыс. рублей), в 2020 году – 92,7 процента (остаток ассигнований - 166 839,3 тыс. рублей).

9. Контрольно-счетная палата отмечает сохранение тенденции неравномерного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов: основное расходование бюджетных средств произведено в IV кварталах 2019 и 2020 годов (47,8 процента и 44,2 процента от общего объема произведенных расходов за год соответственно).

10. В общем объеме кассовых расходов за 2020 год (9 989 966,0 тыс. рублей) расходы бюджета в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики Карелия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), на иные цели, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных в рамках реализации региональных проектов, составили 1 442 740,7 тыс. рублей, или 14,4 процента от общих расходов в рамках национальных проектов (в 2019 году - 915 039,2 тыс. рублей, или 12,9 процента).

11. Согласно представленным главными распорядителями бюджетных средств отчетам по ф.0503738-НП объем неисполненных бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2021 в части средств, предоставленных из бюджета Республики Карелия в форме субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, составил 33 697,4 тыс. рублей (главными распорядителями проведена работа по согласованию к использованию в 2021 году остатков средств,

числящихся на счетах учреждений, в соответствии с их целевым назначением, в том числе на исполнение принятых по состоянию на 01.01.2021 бюджетных обязательств).

12. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» для закупки оборудования (МФУ, ноутбуков, интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением) для 101 муниципального образовательного учреждения на общую сумму 220 190,322 тыс. рублей (включая поставку, монтаж и пуско-наладочные работы) ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» была предоставлена субсидия на иные цели, за счет которой автономным учреждением фактически проведена централизованная закупка в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ.

По мнению Контрольно-счетной палаты, проведение централизованных закупок (и, в частности, для системы образования) необходимо осуществлять в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

13. В общем объеме кассовых расходов на реализацию национальных проектов на территории Республики Карелия расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований составили в 2019 году - 1 864 616,3 тыс. рублей (26,2 процента от общего объема расходов на реализацию национальных проектов), в 2020 году – 2 832 955,1 тыс. рублей (28,4 процента). Исполнение плановых бюджетных ассигнований в целом за 2019 год составило 77,3 процента, за 2020 год – 91,8 процента (объем неисполненных бюджетных ассигнований за 2019 год составил 548 306,7 тыс. рублей, за 2020 год - 252 202,5 тыс. рублей.)

14. Межбюджетные трансферты предоставлены местным бюджетам в 2019 и 2020 годах за счет средств федерального бюджета в суммах 1 553 579,4 тыс. рублей и 2 537 951,1 тыс. рублей соответственно, за счет средств бюджета Республики Карелия – в суммах 311 036,9 тыс. рублей и 295 004,0 тыс. рублей соответственно.

15. В составе межбюджетных трансфертов расходы на предоставление субсидий составили в 2019 году - 772 767,4 тыс. рублей (или 61,0 процента от плана), в 2020 году – 2 221 732,6 тыс. рублей (90,0 процента); расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов - в 2019 году – 1 091 848,9 тыс. рублей (исполнение составило 95,2 процента), в 2020 году – 611 222,5 тыс. рублей (99,3 процента).

16. По результатам мониторинга Контрольно-счетной палатой установлены факты несоответствия объемов кассовых расходов, отраженных в отчетах о ходе реализации отдельных региональных проектов за 2020 год, размещенных в информационной системе проектной деятельности, данным отчета по ф.0503117-НП.

17. В целом расходы за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия на реализацию региональных проектов составили:

за 2019 год - 7 166 825,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 7 117 023,1 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 49 802,7 тыс. рублей;

за 2020 год составили 10 033 399,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) –

9 989 966,0 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 43 433,5 тыс. рублей.

18. В соответствии с представленными отчетами о ходе реализации региональных проектов:

по итогам за 2019 год: из 163 целевых показателей, плановые значения по которым установлены, выполнены 107 показателей (или 65,7 процента); не достигнуты целевые значения по 13 показателям (8,0 процента); фактическое исполнение по 33 целевым показателям (20,2 процента) не отражено в отчетах; в части 10 показателей (6,1 процента) отчеты по установленной форме не представлены;

по итогам за 2020 год: из 193 целевых показателей, предусматривающих плановые значения, выполнены 169 показателей (или 87,6 процента); отражены как не достигнутые целевые значения по 18 показателям, из них 13 показателей (6,7 процента) фактически не выполнены, по 5 показателям (2,6 процента) в пояснениях отражено их достижение; отчеты по установленной форме не представлены в части 6 показателей (3,1 процента).

19. За 2019 год из 29 показателей, установленных Соглашениями с муниципальными образованиями Республики Карелия, 28 показателей исполнены полностью, в том числе по 3 показателям – с превышением по отдельным муниципальным образованиям. По одному показателю результативности двумя муниципальными образованиями плановые значения не достигнуты.

В 2020 году исполнены 28 показателей результативности (из 34 установленных для муниципальных образований), из них по 4 показателям - с превышением по отдельным муниципальным образованиям; по 3 показателям отдельными муниципальными образованиями плановые значения не достигнуты; по 3 показателям отчетные данные формируются к 01.04.2021.

20. Отдельными главными распорядителями бюджетных средств в состав рабочих групп по реализации региональных проектов, реализация которых предполагает предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, не включен ни один из представителей муниципальных образований Республики Карелия.

21. В ходе проведенных муниципальными контрольно-счетными органами в рамках параллельного мероприятия контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе при разработке и реализации муниципальных программ на территории муниципальных образований (городских и сельских поселений); при ведении бюджетного учета и отчетности об исполнении местных бюджетов; нарушения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Республики Карелия в рамках реализации Закона № 44-ФЗ, а также в ходе исполнения контрактов (договоров); отдельными муниципальными КСО отмечена тенденция неравномерного освоения бюджетных ассигнований.

Предложения (рекомендации):

1. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию на территории Республики Карелия региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (выборочно)», проведенного параллельно с муниципальными контрольно-счетными органами, в адрес:

Законодательного Собрания Республики Карелия;
Главы Республики Карелия;
Министерства финансов Республики Карелия;
контрольно-счетных органов Петрозаводского, Костомукшского городских округов, Беломорского, Кемского, Кондопожского, Прионежского, Сегежского, Сортавальского муниципальных районов.

2. Правительству Республики Карелия:

2.1. В целях повышения открытости и комплексности сведений о ходе реализации региональных проектов на территории Республики Карелия рассмотреть вопрос установления (актуализации) перечня и объема информации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, курирующих региональные проекты, периодичности и сроков размещения информации.

2.2. С учетом результатов работы по корректировке в соответствии с Указом № 474 национальных, федеральных и региональных проектов совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия рассмотреть вопрос приведения в соответствие документов стратегического планирования в Республике Карелия, включая Стратегию социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, предусматривающих реализацию мероприятий региональных проектов (в том числе в части согласованности целей и задач, показателей итоговых результатов).

3. Органам исполнительной власти Республики Карелия, являющимся ответственными за реализацию на территории Республики Карелия региональных составляющих федеральных (национальных) проектов:

3.1. Обеспечить размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия актуальных версий паспортов региональных проектов и информации о ходе их реализации в соответствии с поручениями Правительства Республики Карелия.

При предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Карелия рассмотреть возможность размещения информации о ходе реализации региональных проектов в разрезе муниципальных образований.

3.2. С учетом проводимой в соответствии с Указом № 474 на федеральном и региональном уровнях корректировки национальных, федеральных и региональных проектов продолжить проведение работы:

по интеграции региональных проектов в государственные программы, с отражением в госпрограммах целей, задач и показателей региональных составляющих национальных проектов, а также объемов расходов на их реализацию;

по реализации на территории Республики Карелия мероприятий региональных проектов, в том числе обеспечению достижения целей, показателей и результатов проектов в рамках заключенных с федеральными органами исполнительной власти соглашений, полному исполнению обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидий из федерального бюджета.

3.3. Обеспечить контроль за освоением бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия бюджетных средств, предоставляемых в форме субсидии на реализацию мероприятий региональных проектов, сокращением остатков бюджетных средств на счетах учреждений на конец отчетного года.

3.4. Осуществлять контроль за выполнением органами местного самоуправления мероприятий региональных проектов, достижением установленных показателей и результатов в рамках заключенных с органами местного самоуправления Республики Карелия соглашений.

Приложения:

Приложение 1 «Перечень использованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и отчетных документов», на 2 листах.

Приложение 2 «Информация о региональных проектах, реализуемых на территории Республики Карелия в 2019-2020 годах», на 2 листах.

Приложение 3 «Информация о рабочих группах, созданных в целях организации деятельности по реализации региональных проектов и контролю за их исполнением», на 2 листах.

Приложение 4 «Информация об имеющихся проблемах нормативного правового регулирования, организационного, финансового характера по вопросам реализации национальных (региональных) проектов», на 4 листах.

Приложение 5 «Данные об отражении региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в документах стратегического планирования Республики Карелия (по состоянию на 31.12.2020)», на 2 листах.

Приложение 6 «Анализ соответствия показателей региональных проектов и показателей государственных программ Республики Карелия по итогам отчетов за 2019 год», на 10 листах.

Приложение 7 «Анализ отражения в государственных программах Республики Карелия результатов региональных проектов, целевые показатели которых не являются целевыми показателями государственных программ Республики Карелия, по итогам отчетов за 2019 год», на 1 листе.

Приложение 8 «Анализ соответствия показателей региональных проектов и показателей государственных программ Республики Карелия по состоянию на 01.10.2020», на 9 листах.

Приложение 9 «Анализ отражения в государственных программах Республики Карелия результатов региональных проектов, целевые показатели которых не являются целевыми показателями государственных программ Республики Карелия, по состоянию на 01.10.2020», на 2 листах.

Приложение 10 «Анализ расходов бюджета Республики Карелия на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов в разрезе источников финансового обеспечения за 2019 год», на 1 листе.

Приложение 11 «Анализ расходов бюджета Республики Карелия на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов в разрезе источников финансового обеспечения за 2020 год», на 1 листе.

Приложение 12 «Анализ расходов бюджета Республики Карелия на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов в разрезе главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия за 2019 год», на 1 листе.

Приложение 13 «Анализ расходов бюджета Республики Карелия на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов в разрезе главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия за 2020 год», на 1 листе.

Приложение 14 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на реализацию национальных проектов в рамках государственных программ Республики Карелия за 2019 год», на 1 листе.

Приложение 15 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на реализацию национальных проектов в рамках государственных программ Республики Карелия за 2020 год», на 1 листе.

Приложение 16 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на реализацию национальных проектов по видам расходов за 2019 год», на 1 листе.

Приложение 17 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на реализацию национальных проектов по видам расходов за 2020 год», на 1 листе.

Приложение 18 «Информация о принятых бюджетных обязательствах на закупку расходов на закупку товаров, работ, услуг, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также в целях капитального ремонта государственного имущества на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов за 2019 год», на 1 листе.

Приложение 19 «Информация о принятых бюджетных обязательствах на закупку расходов на закупку товаров, работ, услуг, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также в целях капитального ремонта государственного имущества на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов за 2020 год», на 1 листе.

Приложение 20 «Информация об объемах субсидий, предоставленных из бюджета Республики Карелия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов, за 2019 год», на 1 листе.

Приложение 21 «Информация об объемах субсидий, предоставленных из бюджета Республики Карелия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию национальных и федеральных (региональных) проектов, за 2020 год», на 1 листе.

Приложение 22 «Информация о расходах бюджетных и автономных учреждений на реализацию мероприятий региональных проектов, в части закупки товаров, работ, услуг, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также в целях капитального ремонта государственного имущества, за 2020 год (при использовании субсидий на иные цели и субсидий на цели осуществления капитальных вложений)», на 1 листе.

Приложение 23 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Карелия в целях реализации национальных проектов за 2019 год (в разрезе источников финансового обеспечения)», на 1 листе.

Приложение 24 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Карелия в целях реализации национальных проектов за 2020 год (в разрезе источников финансового обеспечения)», на 2 листах.

Приложение 25 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Карелия в целях реализации национальных проектов за 2019 год (в разрезе муниципальных образований)», на 2 листах.

Приложение 26 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям

Республики Карелия в целях реализации национальных проектов по состоянию на 01.10.2020 и за 2020 год (в разрезе муниципальных образований)», на 2 листах.

Приложение 27 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на предоставление в межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Карелия в целях реализации национальных проектов по состоянию на 01.10.2020 и за 2020 год (в разрезе главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия)», на 1 листе.

Приложение 28 «Информация о расходах бюджета Республики Карелия на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Карелия в целях реализации национальных проектов по состоянию на 01.10.2020 и за 2020 год (в разрезе государственных программ Республики Карелия)», на 1 листе.

Приложение 29 «Данные о фактическом достижении запланированных показателей и результатов региональных проектов по состоянию на 01.10.2020 и за 2020 год», на 7 листах.

Приложение 30 «Информация о достижении целевых показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в рамках реализации национальных проектов за 2019 год», на 9 листах.

Приложение 31 «Информация о достижении целевых показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в рамках реализации национальных проектов за 2020 год», на 9 листах.

Приложение 32 «Информация о выявленных муниципальными контрольно-счетными органами Республики Карелия нарушениях и недостатках в рамках проведения параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию на территории Республики Карелия региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (выборочно)», на 9 листах.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия

М.Е. Клименкова
